




Programma
Digitalisering
Strafrechtketen

Bijlage: stand van zaken doelstellingen en projecten Juli tot en met december 2021

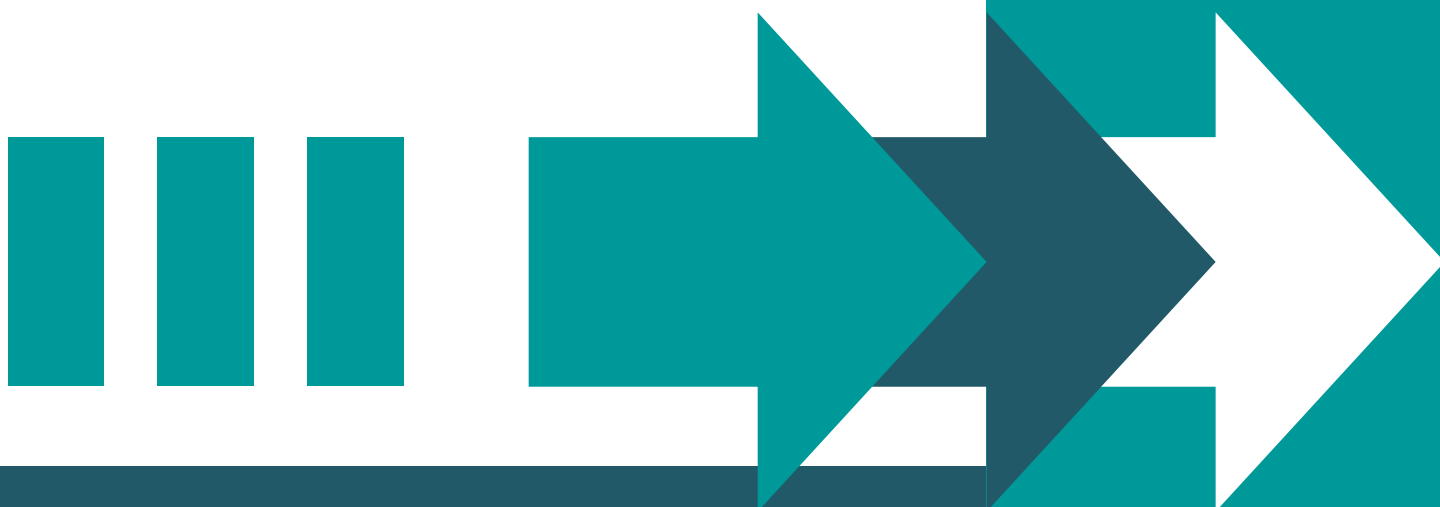

Verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de partners in de strafrechtketen.

Colofon

Opdrachtgever BKB / OGB
Programma Digitalisering Strafrechtketen

Datum 17 januari 2022

Versie 1.0

Status Definitief

Inhoudsopgave

1. Duurzaam digitaal stelsel	4
2. Ketenvoorzieningen	5
3. Multimedia	7
4. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten	8
5. Dienstverlening	12
6. Mijlpalen Programmaplan	14
7. Lijst met afkortingen	16

1. Duurzaam digitaal stelsel

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget*	Real*	Okt	Nov/Dec
Duurzaam digitaal stelsel (DDS)			€ 200	€ 103	●	●
Innovatie			€ 1.125	€662		
Versterken Architectuurraad (AR)			€ 1.800	€1.275		
Versterken Portfolioraad (PR)			€ 650	€ 850		
Versterken Datakwaliteit			€ 1.500	€1336	●	●

* € in duizendtallen

Innovatie

Voor 2021 is er een budget van 1,125 miljoen euro gereserveerd (2,5% van jaarbegroting) voor innovatie. Dit is bewust bescheiden, gezien de majeure opgave waarvoor de strafrechtketen staat. Er zijn 6 experimenten afgerond en 1 experiment (Vervolg Panklaar) is doorgeschoven naar 2022

Experiment	Budget	Status voortgang
Cidar	€ 40	100%
Jurirobot	€ 144	100%
Procesmining Strafrechtketen	€ 124	100%
Panklaar voor beoordeling	€ 133	100%
Opportuniteit 2.0	€ 10	100%
Vervolg Panklaar voor beoordeling	€189	0%
Nextgen DNA Decision Making	€ 117	100%

* € in duizendtallen

Versterken Netwerk Datakwaliteit (NDK)

Door het Netwerk Datakwaliteit wordt de uitval en het aantal, onuitlegbare fouten op de koppelvlakken geminimaliseerd, waardoor de strafrechtketen als geheel invulling kan geven aan haar wettelijke taak. De tweede helft van het jaar is gewerkt met een herijkt werkpakket. Vanwege onderhoud aan het GPS-systeem van het OM zijn een aantal oorspronkelijk voor NDK2021 bedoelde user stories doorgeschoven naar 2022.

Er wordt ten behoeve van het Duurzaam digitaal stelsel (DDS) een voorstel uitgewerkt voor de transitie van het NDK naar een continue vorm.

2. Ketenvoorzieningen

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Okt	Nov/Dec
Ketenvoorzieningen Q1-Q2			€ 3.100	€2.755	●	●
Ketenvoorzieningen Q3-Q4*					●	●
Toeziichten			€ 1.000	€1.000	●	●
Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten			€500	€ 362	●	●
Oplevering geteste E handtekening Straf	31-12-'21	31-12-'22				
Persoonsgericht werken					●	●
Eerste versie stoplichtvoorziening (2 ^e release)	31-10-'20	n.v.t..	€ 0	€ 0		
Commissie Feiten en Tarieven			€80	€ 0	●	●
Datamodel in CFT	30-06-'20	n.t.b.				
Ontwikkeling CFT in EBX	31-12-'20	n.t.b.				

○= nog niet gestart

* Middelen hiervoor zijn met het vaststellen van het programmaplan en halfjaarplan Q1/Q2 2021 meegenomen

E-voorzieningen

Geformuleerde doelstelling Ketenvoorzieningen: de benodigde digitale keten-communicatievoorzieningen zijn ingericht om het duurzaam digitaal stelsel te ondersteunen, inclusief afspraken, beheer en informatiemanagement. Deze zijn afgeleid van de Ketendoelarchitectuur (KDA). De opdrachtformulering Ketenvoorzieningen is gebaseerd op de leidende principes en de KDA. De opdrachtformulering is uitgewerkt in plannen 2021 welke door het OGB zijn goedgekeurd. Voor jaar 2022 worden 2 halfjaarplannen opgesteld.

Het 'richten' is hiermee vorm gegeven en het 'inrichten' en 'verrichten' is hiermee gestart. Dit vraagt nog een aanzienlijke inspanning van een groot aantal partijen en kent nog de nodige onzekerheden en is o.a. afhankelijk van de nog op te leveren transitie strategie. Voor Ketenvoorzieningen worden er dus wel stappen gezet, maar loopt het achter op de initiële ambities. Dit traject loopt door tot na 2022 en vraagt dientengevolge extra aandacht voor de financiering na 2022. Daarmee is de kleurstelling op 'oranje' gezet.

Toeziichten

De doelstelling van de digitalisering van de toezichtsopdrachten is ervoor om te zorgen dat de Politie en uitvoeringsorganisaties, zoals reclassering, tijdig en

volledig beschikken over uitvoerbare toezichtsopdrachten, door het borgen van de ketenbrede procesafspraken in de digitalisering en de professional daarop te faciliteren.

De realisatie door CJIB en Politie is afgerond, de ketentest is van start gegaan en al in december ipv januari succesvol afgesloten. CJIB is gestart met realisatie van wijzigingen die oorspronkelijk achter de ketentest gepland stonden, zodat die wijzigingen in januari in een ketentest geverifieerd kunnen worden. Hierop volgen de proefmigraties, het inhoudelijk op niveau brengen van CJIB systemen, de feitelijke migratie half februari en daarna is de livegang een feit.

Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten

Doel van het project is een voorziening te realiseren om het werken in Hoger Beroep te digitaliseren.

Per 21 september 2021 is er een nieuwe projectleider gestart. Het is op dit moment onduidelijk wat de exacte status en scope is van het project en daarmee wat er reeds is gerealiseerd, wat nog gerealiseerd dient te worden en wat dit kost. Helaas is de projectdocumentatie niet op orde en bestaan er verschillende beelden over de status van het project bij diverse betrokkenen. Wel is duidelijk dat er een E-koppeling gebouwd en dat het project doorloopt tot eind 2022. Een afwijgingsrapportage hiervoor is goedgekeurd in het OGB van november. Gezien bovenstaande is de kleurstelling 'oranje'.

Persoonsgericht werken

Het doel van het project is het inrichten van een werkwijze dat persoonsgericht werken bij meerplegers mogelijk maakt, inclusief duurzame koppeling tussen de TM en GPS.

De realisatie van de software is gereed en per 1 februari 2021 ook daadwerkelijk in gebruik genomen.

De eerste release van de stoplichtvoorziening aanpak meerplegers is open gezet op 1 februari 2021. Er zal eerst ervaring opgedaan moeten worden met het gebruik van de eerste release en de impact op de keten. Eventuele bevindingen worden in de tweede release meegenomen en zullen, indien nodig, leiden tot een aanvraag voor projectgeld in november van 2021. Hiervoor is een nieuw projectplan voor 2022 ingediend. Deze aanvraag is door het OGB afgewezen.

Commissie Feiten en Tarieven (CFT)

Doel van het project is om samen met Justid tot een vernieuwd CFT systeem te komen, waardoor de informatievoorziening weer 'up tot date' is en de database weer door alle partijen goed gebruikt kan worden.

Het project zoals ook vermeld in de vorige voortgangsrapportage en gemeld in de laatste RFC staat momenteel stil. De oplossing (CFT) zou onderdeel worden van het systeem EBX, van JustID. Medio april worden de gesprekken met Justid weer opgepakt om de start van dit project te bespreken. Die zijn goed verlopen. Gesprekken met de leverancier rondom de start van de ontwikkeling zijn gestart. In overleg met de leverancier, Justid en het OM is besproken om CFT in 2022 te gaan ontwikkelen en op te leveren uiterlijk Q2 2022. Dit omdat EBX eerst zo goed als afgerond moet zijn (dat wordt Q4 2021 opgeleverd) en de medewerkers van CFT in de tweede helft van het jaar te druk zijn met het doorvoeren van alle wijzigingen in CFT om ook nog een bijdrage te leveren aan het project. Als de planning definitief is zal hier een RFC voor worden ingediend bij PDSK om hier akkoord op te krijgen.

3. Multimedia

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Okt	Nov/Dec
Multimedia Politie			€ 3.000	€ 1.100	●	●
Definitiefase	30-06-'21	30-06-'21				
PoC	30-09-'21	31-01-'22				
Integratie- / (gebruikers) acceptatietesten	31-12-'21	30-04-'22				
Pilot Proces Implementatie	31-04-'22	31-07-'23				
ingebruikname	31-12-'22	31-12-'23				
Multimedia Rechtspraak			€ 860	€ 750	●	●
Uitvoeringsfase plateau 1: Rechtspraak intern functionaliteit	30-06-'21	30-06-'21				
Landelijke uitrol	30-06-'21	31-08-'21				
Uitvoeringsfase plateau 2: doorontwikkeling in keten	31-12-'21	31-03-'23				
Implementatie plateau 2	31-12-'21	31-10-'22				
Multimedia Openbaar Ministerie		n.t.b.	€ 1.000	€ 150	●	●

○ = nog niet gestart

Multimedia politie

De scope van het project omvat het realiseren van een generieke multimedia voorziening voor de politie met als belangrijkste functies het ontvangen, opslaan, bekijken/beluisteren, simpele bewerking en het overdragen van multimedia in de keten. In het OGB van november is de PID 2.0 goedgekeurd. Het project van het politie is gestart met de realisatie van de waarmerkvoorziening multimedia. De specificaties zijn gebaseerd op de oplossingsarchitectuur versie 0.9.

Per 1 februari 2022 starten twee extra realisatieteams, die zich richten op de overdrachtsservice en de multimedievoorzieningen.

Multimedia Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie heeft op basis van haar scenariokeuze in Q1-2021 een hoog-over plan van aanpak ingediend. De daarin vastgelegde deliverables zijn opgeleverd (pva tot marktverkenning, Business Requirements, PSA). Bij de uitwerking is duidelijk geworden dat het Openbaar Ministerie er de voorkeur aan geeft om ook al met multimedia in High-impact Crime zaken aan de slag te gaan.

De planfase kost echter meer tijd. In het proces is duidelijk geworden dat een aanbesteding toch

noodzakelijk is. De aanbesteding voor het content managementsysteem dat ook wordt gebruikt voor multimedia is uitgezet in de markt, samen met de uitvraag voor een case managementsysteem. De RFC voor latere oplevering van plannen en lagere kosten 2021 ligt ter goedkeuring voor bij het OGB.

Multimedia Rechtspraak

Na een geslaagde pilot bij twee rechtbanken van een voorziening waarmee multimedia op een relatief eenvoudige en betrouwbare wijze in rechtbanken kan worden gebruikt is op 20 december 2021 de landelijke uitrol gestart van deze voorziening bij de overige rechtbanken.

Er is een start gemaakt met het inrichten van een helpdesk voor multimediaconversie op de locaties van de Rechtspraak. Dit biedt de Rechtspraak een tijdelijke oplossing voor conversie van multimediamateriaal dat nog niet conform de ketenbrede standaards is aangeleverd.

Ketenbrede activiteiten

De voortgang van multimedia in de werkpakketten van Ketenvoorzieningen wordt separaat gerapporteerd aan het OGB.

4. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten

Project	Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Okt	Nov/Dec
Digitaal Pr	Dicas Hoge Raad			€ 550	€ 480	●	●
	Provenancestore - GAAV (ketenvoorziening)	30-09'21	30-11-'21				
Proce	Dicas 2			€760	€454	●	●
	Digitale dossieroverdracht (papier uit de keten)	30-09'21	31-12-22				
Go-no go	SODA						
	DWD aansluiten op Divos	15-09'21	15-09'21	€ 1.000	€ 727	●	●
Digitaal w	DWD aansluiten op generieke DT componenten	27-02'22	27-02'22				
	Realisatie E-koppeling dossierbeheer OM	21-11'22	21-11'22				
	FO Sporen						
	Afsprakenstels	31-12-'21	31-12-'21	€ 1.175	€ 1.050	●	●
	Ontwerp OM proces	01-08-'21	01-08-'21				
	Realisatie ketenintegratie componenten NFI	31-12-'21	31-12-'21				
O= nog niet gestart							
Digitale Sa	Ontwerpfase	30-09-'21	31-12-'21				
	vervolg	n.t.b.	n.t.b.				
Digitale Documentroutering				€ 0	€ 0	●	●
	Opslag digitaal ondertekende PV in CDO2	30-09-'20	31-09-'21				
	Routeren digitaal ondertekende PV's in pré-intake	31-12-'20	31-12-'21				
Versnelling AICE				€ 3.450	€3.450	●	●
	Voorlopige Hechtenis OM-AICE ICT	31-12-'21	31-12-'22				
	VBS JTS Strafbeschikking ICT	31-12-'21	31-12-'21				
	Digitalisering executieketen i.r.t. vrijheidsbeneming	31-12-'21	31-12-'21				
	Vrijheidsbenemende Eindbeslissingen - Digitale interactie	31-12-'21	31-12-'22				
Digitaliseren Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming –				€ 4.400	€ 3.965	●	●
	Plateau 1 (1e zaakstroom VH)	28-01'22	31-03-'22				
	Plateau 2 (.zaakstroom eindbeslissingen aansluitend op ...)	31-12-'22	31-12-'22				
Uitwisseling risicogegevens				€ 960	€952	●	●
	Voorbereiding implementatie en impactanalyse	31-05-'21	31-05-'21				
	Implementatie ketenbrede uitwisseling via portaal (2021)	30-06-'22	30-06-'22				
Digitalisering Mulderberoepen				€ 1.445	€ 1.350	●	●
	Uitgebreide versie voor beoordelen beroepen OvJ	30-09-'21	31-03-'22				
	Basis versie voor beoordelen beroepen Kanton	30-09-'21	31-03-'22				
Digitalisering Mulderberoepen fase 3							
	Nieuwe processen doorgevoerd	Q3-'22	Q4-'22	€ 600	€ 605	●	●
	Appel-unit aansluiten	Q3-'22	Q3-'22				
	Koppeling systemen OM-Rechtspraak gereed	Q3-'22	Q4-'22				
BOB-module				€ 0	€ 0	●	●
	Oplevering BOB-module (release 1 t/m 3)	30-09'21	30-09-'21				
	Start Landelijke uitrol BOB-module	30-07-'21	31-12-'21				

Digit
aal
Proc
es
Dossi
er
(DPD
)
Stat
us
van
het
over
all
proje
ct is
in
dece
mber
van
oranj
e
versc
hove
n
naar
groe

n. De OTV-audit blokkade is opgeheven, de DPD plannen voor 2022 en 2023 zijn goedgekeurd, de herziene planning is goedgekeurd en de resourcing is weer op orde. De herstart van de procesimplementatie staat gepland op 7 februari 2022.

Het politie implementatieteam is opnieuw geformeerd en de on-boarding van dit team verloopt inmiddels goed. In de tussentijdse periode heeft het overgebleven DPD projectteam gewerkt aan het toevoegen van functionaliteiten en het gereed maken van DPD MVP 1.2 voor de komende live-gang. Daarnaast wordt er gewerkt aan het straks in beheer kunnen brengen van de DPD applicatie.

Digitale werken in hoger beroep

Om het werken in het Hoger Beroep te kunnen digitaliseren, beoogt het project de ontstane documenten in het Rechtspraak domein te kunnen voorzien van een elektronische handtekening. De gerechtshoven Den Haag, Amsterdam, Den Bosch en Arnhem/Leeuwarden draaien productie volgens verwachting met alle zaakstromen minus de MK-preventieven. Het belangrijkste knelpunt blijft de vertraagde oplevering van de koppeling tussen OM en ZM. Het belangrijkste winstpunt is de release met meervoudige verstrekkingen voor preventieven, waardoor de proeftuin Den Haag op 100% overdracht zit van de digitaal beschikbare zaken. De koers is sinds de laatste stuurgroep gericht op overdracht naar beheer en borging van de reeds bereikte resultaten, inclusief de wijze van IT-voortbrenging en implementatie in 2022.

Digitale Samenwerkingsruimte (DSR) ZSM

Het project DSR-ZSM richt zich op de ondersteuning van de informatievoorziening (gegevensuitwisseling, administratieve handelingen en coördinatie en sturing) van het samenwerkingsverband op ZSM. Zodat op efficiënte en effectieve wijze iedere rol op ZSM de noodzakelijke informatie (op inhoud en proces) tijdig en volledig heeft, waardoor persoons- en contextgericht gewerkt kan worden.

Het OGB heeft ingestemd met het vooronderzoek budget van 1,1 M euro, onder de voorwaarde dat het

OM de besproken negen producten per 1 september 2021 oplevert. De uitvoering van het project DSR/ZSM is vertraagd. Afronding van de ontwerpfase wordt nu Q1 2022 verwacht en de eerste indicaties van het project geven aan dat de kosten substantieel hoger uitvallen dan begroot. In de huidige vastgestelde projectportfolio het project DSR/ZSM niet opgenomen. Kleurstelling project blijft "rood".

Digitale Documentrouting

Doel van het project is het creëren van een koppeling CORSA-EIS-GPS, zodat overbodige administratieve handelingen worden voorkomen en er een efficiënter proces voor het verwerken van processen-verbaal ontstaat.

Nadat er een mooie eerste stap is gezet in het automatiseren van de gegevensuitwisseling tussen TM (CJIB) en GPS (OM) zodat zaken niet meer handmatig ingeklopt hoeven te worden, is de doorontwikkeling erop gericht om de (digitaal ondertekende) processen-verbaal centraal op te slaan in een centrale opslag zodat de ketenpartners deze elektronisch kunnen ontsluiten. Deze stip op de horizon wordt in tussentijdse stappen gerealiseerd. Eerst worden de digitaal ondertekende PV's gerouteerd via het CJIB naar het CVOM. Ook deze tussenstap is opgedeeld in kleinere tussenstapjes en resultaten met business value (papier uit de keten). Een gezamenlijke werkgroep CVOM/CJIB/Justid is bezig deze roadmap verder uit te werken. Om de volgende stap volledig helder te krijgen is opdracht gegeven aan het OM, Justid en CJIB om (allen apart) een impactanalyse op te leveren. De opdracht voor het uitvoeren van de IA aan de zijde van het OM is akkoord bevonden. Ook Justid en CJIB is gevraagd worden een IA uit te voeren. Afhankelijk van de resultaten van de verschillende analyses zal het verdere verloop van dit project vast worden gesteld en al dan niet extra tijd en budget gevraagd worden bij PDSK.

Versnelling AICE (VAICE)

Versnelling AICE is gestart naar aanleiding van de implementatie van de wet USB per 1 januari 2020.

In 2021 ligt de focus op het verder digitaliseren van zaakstromen, uitbouwen van persoonsgericht werken & beoordelen en transitie naar volledige digitale interactie met ketenpartners.

Twee deelprojecten (VH en VBE) ondervinden vertraging in de uitvoering. De consequenties hiervan zijn uitgewerkt en gerapporteerd aan het CBE. Aan het project is gevraagd een afwijkingsrapportage aan te leveren. Er is een Afwijkingsrapportage aangeleverd maar deze is nog niet volledig. Kleurstelling project blijft "rood".

Digitaliseren Executieketen

Doel is het digitaliseren van de gegevensuitwisseling tussen CJIB, DJI en overige partners in de executieketen. Dit betreft uniformering en standaardisering van informatieproducten en werkwijzen ter verhoging van de datakwaliteit en efficiency.

Het afgelopen jaar zijn flinke stappen gezet in de digitalisering van de executieketen i.r.t. vrijheidsbeneming. Het ontwerp van het koppelvlak CJIB - DJI voor plateau 1 en de daarvoor benodigde aanpassingen aan de applicatielandschappen van het CJIB en de DJI zijn gerealiseerd. Het project is bezig met de laatste loodjes van de ketenacceptatietesten en ook hier wegen die het zwaarst. De implementatiefase van plateau 1 is in volle gang en naar verwachting zal de livegang van de zaakstroom VH voor volwassenen uiterlijk eind 1e kwartaal 2022 een feit zijn. Daarnaast is het ontwerp van plateau 2, dat door de SRK-AR werd omschreven als "een goed voorbeeld van de wijze van toepassing van het afsprakenpatroon in een dienstgeoriënteerde aanpak", door de ketenstuurgroep goedgekeurd en is de realisatiefase al gestart.

Uitwisseling risicogegevens

Doel is het verbeteren van de datakwaliteit handelingsgegevens bij ketenpartners en het uitvoeren van impactanalyses met betrekking tot registreren en ontsluiten risicogegevens. De betrokken ketenpartners in hun rol als leveranciers hebben vertraging bij het ontwerp en realisatie van de koppelvlakken waardoor de realisatie en de gerelateerde kosten ad € 440K in Q1

2022 vallen i.p.v. 2021. De gerelateerde afwijkingsrapportage is in november goedgekeurd door het OGB.

Digitalisering Mulderberoepen

Dit project realiseert een systeem waarmee zo efficiënt mogelijk de Mulder-beroepen kunnen worden beoordeeld en afgehandeld door medewerkers van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Project bevindt zich in de afrondende fase en de verwachte oplevering is Q1 2022. Voor fase 3 is een nieuw project opgestart.

Digitalisering Mulderberoepen fase 3

In fase 3 wordt het nieuwe Mulder systeem ook toegankelijk maken voor de Appèl unit. Dit draagt bij aan de doelstelling 'papier uit de keten' omdat de Appèl unit momenteel nog volledig analoog werkt. Daarnaast wordt de rechtspraak aangesloten waardoor de papieren overdracht van gegevens tot het verleden gaat behoren. Tot slot is het de bedoeling het nieuwe AMBer laten aansluiten op DLV en het horen-traject te laten ondersteunen, zodat de doorloop van het proces verbetert en doorlooptijd van beroepen naar beneden gaat. Daardoor verbetert ook de dienstverlening aan de burger en leveren we dus ook aan die doelstelling een bijdrage.

In de afgelopen periode zijn er meerdere sessies geweest met CJIB, CVOM en ZM waarin we de uitwisseling van documenten hebben besproken. Aangezien de verschillende primaire processystemen die het ZM gebruikt nog niet gekoppeld zijn/of kunnen worden met de nieuwe bestandenpostbus/dossier, zal de XML-koppeling tussen beide systemen stapsgewijs vorm worden gegeven. Hoe deze fases eruit gaan zien zal op korte termijn worden besloten. Doel is om in ieder geval het rechtbankdossier vanuit MAPS naar de ZM te krijgen. Begin januari staat een stuurgroep sessie gepland waarin het vraagstuk rondom de architectuur die we bij de koppeling gaan toepassen onderdeel van gesprek zal zijn.

BOB-module

Dit project richt zich op het realiseren van een robuuste BOB (bijzonder opsporingsbevoegdheden) module. Hierbij is het uitgangspunt dat een BOB-aanvraag in de strafrechtketen geautomatiseerd kan worden ingediend. Product is klaar en de landelijke uitrol start in januari 2022.

Dicas Hoge Raad

Doelstelling is om de door de Hoge Raad aan CDD+ (Centraal Digitaal Depot) aangeboden arresten te voorzien van een handtekening op basis van hashes en de hashes vast te leggen in de Centrale Provenance Store, zodat de arresten via de GAAV Validatieservice gevalideerd kunnen worden. Daarmee is dus de vraag om aan te sluiten, vanuit CDD+, op CPS/GAAV. In januari 2021 is de realisatie gestart. Begin november is product in productie gegaan en decharge is opgeleverd.

Dicas 2

Doelstelling project: dossiers in zaken die digitaal zijn behandeld in eerste en tweede aanleg worden, in geval van cassatie, digitaal overgedragen aan de Hoge Raad. De Rechtspraak heeft geconstateerd dat de recent opgeleverde PSA op korte termijn niet een werkende oplossing voor dossieruitwisseling oplevert. In samenwerking met de Rechtspraak is er een voorstel voor een werkende oplossing voor dossieruitwisseling uitgewerkt. Dit resulteert in een langere doorlooptijd en extra kosten. De gerelateerde afwijkingsrapportage is in november goedgekeurd door het OGB.

Straf op Digitaal Werk Dossier (DWD) aansluiten (SODA)

Het project richt zich op hernieuwde digitale logistiek, inclusief de benodigde administratieve functies, van de Strafdossiers vanuit de aanlevering van het OM, waarbij de aansluiting op DWD optimaal wordt ondersteund.

De afhankelijkheden met andere teams zijn geïdentificeerd en een gezamenlijke faseplan is opgesteld. Q4 is gebruikt voor het ontwerp van de Zaak & Zittings API (fase 1) en voor het opstellen van Epics

en User Stories voor de ontwikkeling van DZD (voorbereiding fase 2). Vanaf januari is in de teams van GKV & DT tijd gereserveerd voor de realisatie van Fase 1 en Fase 2. De E-koppeling is bij het OM terug op de portfolio. Of hiermee het risico rondom Fase 3 volledig is afgedekt moet in de komende periode blijken.

FO Sporen

Doel is om te komen tot een afgestemd, verbeterd en 'lean' ketenproces voor het forensisch onderzoek. Dit ketenproces wordt ondersteund met een digitale uitwisseling van gegevens tussen de ketenpartners. Het FO (Forensische Opsporing) dossier wordt op een digitale manier geautoriseerd gedeeld, daar waar het van nut dient voor de duiding van het onderzoek. Door middel van processtapinformatie en notificaties informeren de ketenpartners elkaar direct tijdens het forensisch onderzoek. Uitvoering project vindt conform planning plaats.

5. Dienstverlening

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Okt	Nov/Dec
Slachtofferportaal (Mijn Slachtofferzaak)			€ 1.000	€ 760	●	●
Slachtofferportaal OM			€ 100	€ 10	●	●
nieuwe technische services en business services op NIAS (OM en ZM)	Q3 2020	Q3 2021				
Advocatenportaal			€ 2.600	€ 2.086	●	●
Fase I Spoor 1 - Portaal (DTP)	31-12-'21	16-11-'21				
Fase I Spoor 2 - Distributiefunctie (DT)	31-12-'21	20-11-'21				
Fase 1 Spoor 3 - Berichtverwerking in PPS	30-06-'21	01-10-'21				
Fase 1 implementatie MVP	31-12-'21	31-03-'22				
Advocaten portaal fase 2	31-12-'21	31-05-'22				
Digitaal Betekenen			€ 2.100	€ 1.652	●	●
Realisatie fase 3 2 ICT(GPS - verwerkservice outputmanagement OM met MijnOverheid)	01-08-'21	01-08-'21				
Aanpassing IV/ICT MijnOverheid	01-08-'21	01-08-'21				
Praktijkproef afgerond	01-11-'21	31-12-'21				
Ingericht proces incl. aangepaste AO	Q4 2021	Q2 2022				
Livegang NIAS	Q1 2021	Q2 2022				
Opleiding medewerkers afgerond	Q4 2021	Q3 2022				
Geautomatiseerde ondersteuning Digitale betekening	Q4 2021	Q3 2022				
Afronding project	Q4 2021	Q4 2022				
Injus			€ 900	€ 976	●	●
Aanpassingen Injus	31-12-'21	31-12-'22				
Definities, uitwisseling en herkomst detentiegegevens	31-12-'21	31-12-'21				
Afronding implementatie verantwoordelijkheden DJI	31-12-'21	31-12-'21				
○= nog niet gestart						

Slachtofferportaal

MijnSlachtofferzaak (voorheen: Ketenbrede Slachtoffer Portaal (KbSP)) heeft als doel slachtoffers van strafbare feiten, zaak inhoudelijk te informeren, maar dan zodanig dat over de strafrecht-keten heen een samenhangend beeld ontstaat. MijnSlachtofferzaak (project in 2019-2020) is op 16 november 2020 landelijk in gebruik genomen. Alle informatie van Politie, Openbaar Ministerie, Slachtofferhulp Nederland, Centraal Justitieel Incassobureau en Schadefonds Geweldsmisdrijven is sinds 16 november 2020 voor het slachtoffer op één

centrale plek te vinden. Dit project is inmiddels gedechargeerd. De doorontwikkeling van MijnSlachtofferzaak is overgedragen aan het samenwerkingsverband. Vanuit dit collectief van partijen is voor 2021-2022 een nieuw traject opgestart. Een aantal activiteiten en gerelateerde kosten schuiven door naar 2022. Er is een RFC aangeboden. Aanbieding was te laat en wordt de volgende maand behandeld.

Advocatenportaal

Het vernieuwde portaal richt zich op een veilige en efficiënte digitale informatievoorziening tussen

strafrechtadvocaten, OM en de Rechtspraak, tot en met de verwerking in de digitale zaakdossiers. Alle functionaliteit van eerste fase Advocatenportaal is opgeleverd voor pilot. Start van pilot i.v.m. bevindingen in het berichtenverkeer toch uitgesteld tot 31 januari 2022. Medio januari 2022 staat een Go/NoGo moment voor start van de pilot in Den Haag en Rotterdam (rechtbanken en hof). Ontwerp en realisatie AP 2.0 op basis van generiek DT-platform (Fase 2) loopt verdere vertraging op a.g.v. beperkte capaciteit bij solutionarchitectuur en in de DT-Portaal en -integratieteams. Beoogde start ontwerp en realisatie in de eerste helft van 2022, mits capaciteit binnen DT-teams en bij GPS-OM (GKV) toereikend is.

Digitaal Betekenen

Doel is het realiseren van het digitaal betekenen van gerechtelijke mededelingen op basis van elektronische overdracht.

Een batchverwerking voor digitaal betekenen in de productie omgeving heeft eind juli tot een ernstige verstoring op de infrastructuur geleid. Eind september is een tijdelijke oplossing in productie genomen. De praktijkproef staat nog steeds on hold. De testzaak in productie kan pas medio januari 2022 worden uitgevoerd. Wanneer het gehele proces goed verloopt wordt de praktijkproef op beide locaties hervat. De vertraging op dit onderdeel bedraagt nu 3,5 maand. De aanpassing van NIAS ligt stil. Op basis van de nota met een toelichting op de overschrijdingen wordt in de portfolioboard een besluit over het vervolg genomen. Mede door de beperkte bouwcapaciteit is de bouw van de controleschermen op Outputmanagement doorgeschoven naar 2022. Hierdoor loopt het project een vertraging op van 6 maanden. Deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor de looptijd van de uitvoeringsfase en daarmee voor de totale doorlooptijd van het project. Dit leidt ook tot extra kosten op het terrein van ICT en Personeel. De noodzakelijke afwijkingsrapportage ligt nu ter goedkeuring voor bij het OGB. Deze afwijkingsrapportage geeft echter nog geen volledig beeld omdat er nog geen inschatting gemaakt kan worden van de extra kosten om de ICT voor de eerste

lijn werkend te krijgen en de extra kosten voor de aanpassing van NIAS en dient te worden aangepast.

Injus

Doel is het voorzien in het verstrekken van detentiegegevens vanuit de keten door het ontwerpen van een nieuw systeem, welke voldoet aan de uitgangspunten van de Ketendoelarchitectuur (KDA).

De vraag naar gegevens over detentieverloop neemt echter toe en de huidige opzet van Injus maakt dat het op maat invullen van nieuwe verzoeken om gegevens over detentieverloop, doorgaans langdurig en duur is. Vandaar dat er behoefte is aan een doel- en transitiearchitectuur. Voor de extra kosten is er een afwijkingsrapportage ingediend en goedgekeurd. De uitvoering van de werkzaamheden liggen op schema.

In 2021 heeft dit project het volgende bereikt:

- De aanbevelingen uit het PWC-rapport over privacy en beveiliging voor Injus zijn opgevolgd, met onder meer jobs voor schoning van de gegevens, monitoring van loggingsgegevens en aansluiting op de Federatieve Service voor autorisatie (was al gebeurd voor 2021).
- De aanbevelingen de het lange-termijnvisie voor Injus zijn opgevolgd, hetgeen heeft geleid tot een analyse van herkomst en verantwoordelijkheden voor gegevens en een gestructureerde aanpak voor de jaarlijkse evaluatie van het gebruik van Injus bij afnemers.
- Het opdrachtgeverschap voor Injus is ingebed bij DJI/DIZ.

Realisatie van de doel- en transitiearchitectuur liggen op schema. De ideeën over het configureerbaar koppelvlak zijn verder uitgewerkt en worden nu verder uitgediept. In november start de realisatie De uitfasering van OSS loopt op schema en de LT-visie, inclusief Solutionarchitectuur en de AR-appreciatie daarvan, is op 4 november in het CBE gepresenteerd en goed ontvangen.

Er ligt een concept voor kosten van het aansluiten op Injus voor de verschillende mogelijkheden die het systeem daartoe biedt.

6. Mijlpalen Programmplan

Fase 1: initiatie fase

01-06-2019 t/m 26-02-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
1	Betrekken Keten Samenwerkingslocatie (PD)	31-07-2019	100%	●
2	Concept werkplan (PD)	12-09-2019	100%	●
3	Jaarplan vastgesteld (OGB)	30-10-2019	100%	●
4	Kwaliteitskader 3.0 vastgesteld	18-12-2019	100%	●
5	Programma resources gestart	31-05-2020	100%	●
6	Werkplan vastgesteld (OGB)	29-01-2020	100%	●
7	Werkplan vastgesteld (BKB)	20-02-2020	100%	●
8	Risicoanalyse	01-06-2020	100%	●
9	Communicatieplan vastgesteld (OGB)	26-02-2020	100%	●
10	Handboek Portfoliomgt. SRK 3.0 vastgesteld (OGB)	25-03-2020	100%	●
11	(voorlopig) start portfolio en strategisch vastgesteld (OGB)	18-12-2019	100%	●

Fase 2: samenstellen portfolio

01-06-2019 t/m 26-02-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
12	Strategisch portfolio vastgesteld (OGB)	29-01-2020	100%	●
13	Strategisch portfolio vastgesteld (BKB)	20-02-2020	100%	●

Fase 3: intake projecten

01-01-2020 t/m 26-02-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
14	Besturing elk project inzichtelijk	01-07-2020	100%	●
15	Projecten inzichtelijk t.o.v. Kwaliteitskader 3.0 (OGB)	01-07-2020	100%	●

Fase 4: afronding Visievorming

01-01-2020 t/m 01-07-2021

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
16	Ketendoelarchitectuur (OGB),	08-07-2020	100%	●
17	Ketenvoorzieningen (OGB)			
	- Opdracht	08-07-2020	100%	●
	- Programmplan	31-03-2021	100%	●
18	Transitiearchitectuur (OGB)	Onderdeel mijlpaal 17	n.v.t.	●
19	Ontwerp Duurzaam Digitaal Stelsel (OGB)	01-05-2021	100%	●
20	Ontwerp Duurzaam Digitaal Stelsel (BKB)	01-07-2021	90%	●
21	Programmplan		100%	
	- Vaststelling (OGB)	25-11-2020		●
	- Vaststelling (BKB)	03-12-2020		

Fase 5: besturen portfolio 2020

01-01-2020 t/m 31-12-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
22	Decharge op basis van de jaarverantwoording 2020 (BKB)	31-12-2020	100%	●

Fase 6: samenstellen portfolio 2021-2022

01-10-2020 t/m 01-12-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
23	Startportfolio 2021 vastgesteld (OGB)	31-12-2020	100%	●
24	Strategisch portfolio 2021-2022 vastgesteld (OGB)	31-12-2020	100%	●
25	Strategisch portfolio 2021-2022 vastgesteld (BKB)	31-12-2020	100%	●

Fase 7: besturen portfolio 2021

01-01-2021 t/m 31-12-2021

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
26	Papier (zoveel mogelijk) uit de keten gerealiseerd (OGB)	31-12-2021 n.n.b.	n.n.g	●
27	Dienstverlening gerealiseerd (OGB)	31-12-2021 31-12-2022	n.n.g	n.v.t.
28	Decharge o.b.v. jaar-verantwoording 2021 (BKB)	31-12-2021	n.n.g	n.v.t.

Fase 8: samenstellen portfolio 2022

01-10-2021 t/m 01-12-2021

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
29	Startportfolio 2022 vastgesteld (OGB)	31-12-2021	100%	●
30	Strategisch portfolio vastgesteld (OGB)	31-12-2021	100%	●
31	Strategisch portfolio 2022 vastgesteld (BKB)	31-12-2021	100%	●

Fase 9: besturen portfolio 2022

01-01-2022 t/m 31-12-2022

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
32	Duurzaam digitaal stelsel implementatie gereed (PD)	31-03-2022 31-12-2022	n.n.g	●
33	Multimedia door de keten (voor VVC)gerealiseerd (OGB)	30-06-2022 31-12-2023	n.n.g	●
34	Continuering Ketenvoorzieningen overgedragen aan DDS (PD)	31-12-2022	n.n.g	n.v.t.
35	Decharge o.b.v. jaar-verantwoording 2022 (BKB).	31-12-2022	n.n.g	n.v.t.

Fase 10: evaluatie en afronding

01-10-2022 t/m 01-12-2022

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
36	2022 Evaluatie implementatie DDS (OGB)	01-07-2022 31-12-2022	n.n.g	●
37	Programma Eind Rapportage vastgesteld (OGB),	31-12-2022	n.n.g	n.v.t.
38	Programma Eind Rapportage vastgesteld (BKB).	31-12-2022	n.n.g	n.v.t.

n.n.g. = nog niet gereed

7. Lijst met afkortingen

3RO	de drie reclasseringsinstellingen		
ABB	Architectuur Bouw Blokken	NFI	Nederlands Forensisch Instituut
ADR	Auditdienst Rijk	NORA	NL Overheid Referentie Architectuur
ADSK	Adviesgroep Digitalisering Strafrechtketen	OGB	Opdrachtgeversberaad
AICE	Administratie- en informatiecentrum Executie	OM	Openbaar Ministerie
AR	Architectuurraad	PD	Programmadirecteur
AZD	Alle-Zaken-Digitaal	PDSK	Programma Digitalisering Strafrechtketen
BAL	Besluiten- en Actielijst	PPAC	Project-, Programma- en Adviescentrum
BIT	Bureau ICT Toetsing	PR	Portfolioraad
BKB	Bestuurlijk Ketenberaad	PSA	Project start architectuur
BVH	Basisvoorziening handhaving	PVR	Programma Vernieuwend Registreren
CBE	Coördinerend Beraad Executieketen	QA	Quality Assurance
CD	Complexe Dossiers	QRAID	Quality, Risks, Actions, Issues, Descisions
CDM	Canoniek Datamodel	RA	Regeerakkoord
CDO	Chief Data Officer	RS	#PM: invullen of verwijderen!
CJIB	Centraal Justitieel Incassobureau	RvdK	Raad voor de Kinderbescherming
DAS	Data Alliantie Strafrechtketen	SK	Strafrechtketen
DB	Digitaal Betekenen	SRK	Strafrechtketen
DFEZ	Directie Financiële en Economische Zaken	Summ-IT	Politieregistratiesysteem van de Nederlandse politie en de opvolger van de Basis Voorziening Opsporing (BVO)
DGSenB	Directoraat-generaal Straffen & Beschermen		
DJI	Dienst Justitiële Inrichtingen	TK	Tweede Kamer
DPD	Digitaal Proces Dossier	TTP JUSTID	Trusted Third Party JUSTID
DPD-VVC	Digitaal Proces Dossier	UBR	Uitvoeringsbedrijf Rijk
DSK	Directie Strafrechtketen	USB	Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen
DSR	Digitale Samenwerkingsruimte	VVC	Veel Voorkomende Criminaliteit
DTOPS	Digitale Transformatie Opsporing Politie en Strafrechtketen	VVE	Vereniging Van Eigenaren
EA	Enterprise Architect	WODC	Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
EPSC	Ethische, Privacy, Security en Compliance	ZOZ	Zicht-Op-Zaken
EPV	Electronisch Proces-Verbaal	ZSM	Zorgvuldig, snel en op maat
FO	Forensische Opsporing		
GPS	Geïntegreerd Processysteem Strafrecht		
ICTU	ICT Uitvoerings Organisatie		
IIR	I-Interim Rijk		
IRF	Inspectie der Rijksfinanciën		
IT	Informatie Technologie		
JUSTID	Justitiële Informatiedienst		
KB-MM	Ketenbrede Multimedia		
KDSK	Klankbordgroep Digitalisering Strafrechtketen		
KIV	Keten Informatievoorziening		
MM	Multimedia		
