



Programma
**Aan de slag met de
Omgevingswet**

Rapportage

Indringend Ketentesten (IKT) Fase 4

Verbreden, verdiepen, verbeteren

Datum juni 2023
Status Definitief

Samenvatting

Deze rapportage bevat de resultaten vanuit het project Indringend Ketentesten (IKT) Fase 4 (verder te noemen IKT-4). In deze fase (testweek 18 tot en met 24 – van medio januari 2023 tot medio april 2023) is weer een niveau complexer en indringender getest, conform plan van aanpak IKT-4, dan in fase 3. Bij de uitvoering van IKT-4 zijn praktisch alle doelstellingen uit het plan van aanpak, gerealiseerd. Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van IKT-4 en de duiding daarvan.

Belangrijkste resultaten en bevindingen Planketen

Tijdens IKT-4 heeft – ten opzichte van IKT-3 - een aantal nieuwe bevoegd gezagen en planleveranciers deelgenomen aan de test. Ook is nieuwe testcasuïstiek uitgevoerd, in het bijzonder interbestuurlijk.

De tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) hebben onderdeel uitgemaakt van de testscope van IKT-4. Specifiek is door provincies (succesvol) getest de 'TAM Voorbereidingsbesluit met meervoudige tijdelijke regelingdelen'. De meeste TAM zijn hiermee in het IKT-proces getest. Er resteren er nog enkele TAM voor provincies in de plan-keten. Deze worden in IKT-5 opgepakt. De resterende TAM zijn daarmee ruim voor inwerkintreding getest.

De lokale software voor de STOP-TPOD-keten heeft stappen gezet, zo is inmiddels integrale tekstvervanging als mutatiwijze bij alle leveranciers beschikbaar. Tegelijk is de lokale software voor de Planketen nog niet volledig uitontwikkeld. Belangrijke functionaliteiten ontbraken nog tijdens IKT-4. Dit betreft de plan-plan-uitwisseling, basismutaties en daarmee samenhangend de parallelle wijzigingen en het tonen van plannen aan de raad. Na beschikbaar komen van deze functionaliteiten zullen deze nog indringend worden getest in samenhang met de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Als alternatief voor de ontbrekende functionaliteiten zijn TAM beschikbaar.

De landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) heeft alle functies opgeleverd, maar een aantal functies wordt nog verbeterd. De belangrijkste verbetering betreft de Viewer Regels op de kaart. Hier is een voortdurende ontwikkeling gaande, zowel qua functionaliteit – denk aan tijdreizen – als qua gebruiksvriendelijkheid. In het bijzonder de functionaliteit voor het tonen van ontwerpplannen heeft nog doorontwikkeling nodig.

De foutmeldingen en waarschuwingen bij het publiceren van een omgevingsinstrument zijn niet altijd begrijpelijk voor eindgebruikers, waardoor de gebruiker niet altijd in staat is om zelfstandig een omgevingsinstrument te publiceren. Dit betreft een samenspel tussen de landelijke voorziening en de lokale software. Het verbeterproces is gestart met betrokken partijen.

De algemene observatie vanuit IKT is dat nieuwe partijen zowel in het maken van content als met het testen en inregelen van hun software een leercurve doormaken gedurende de IKT-testen.

Belangrijkste resultaten en bevindingen toepasbare regels

In aanvulling op de testen in IKT-3 is een beperkt aantal testen met toepasbare regels uitgevoerd in IKT-4. Dit betreft nieuwe testcasuïstiek. Hiermee is het

leeuwendeel van de beoogde testen met betrekking tot toepasbare regels door IKT uitgevoerd.

Er is opnieuw vastgesteld dat het van groot belang is voor de bevoegd gezagen om goed de relatie te bewaken tussen de juridische regels uit de plannen en de toepasbare regels voor de vergunningcheck en de formulieren voor vergunningaanvragen en meldingen. Dit betreft niet zozeer software-functionaliteiten, als wel een correcte implementatie door de bevoegd gezagen zelf.

Het importeren door een bevoegd gezag van toepasbare regels die gemaakt zijn door een ander bevoegd gezag met een andere leverancier, gaat niet altijd goed. Dit wordt onderkend door de betrokken leveranciers en aan een oplossing wordt gewerkt.

Belangrijkste resultaten en bevindingen Vergunningenketen

In IKT-4 zijn voor de Vergunningenketen ten opzichte van IKT-3 aanvullende testen uitgevoerd: met nieuwe leveranciers, en met nieuwe testcasuïstiek. Met IKT-4 is het leeuwendeel van de IKT-testen voor de Vergunningenketen daarmee uitgevoerd. Uit de testen blijkt dat de benodigde functionaliteiten voor inwerkingtreding in de Vergunningenketen aanwezig zijn en dat deze technisch gezien werken. Dit is een herbevestiging in IKT-4 van wat eerder in IKT-3 ook al is geconstateerd.

Een andere observatie tijdens de IKT-testen is dat de inrichting van de lokale werkprocessen en configuratie van software bij het bevoegd gezag aandacht blijven vragen.

Licht dalende lijn testbevindingen in aantal en urgentie

In deze rapportage is wederom een trendanalyse opgenomen over de gehele looptijd van IKT (fasen 1 tot en met 4). Hierbij wordt een lichte daling geconstateerd van het aantal testbevindingen. Daarnaast is een afname waar te nemen van het aantal 'urgente' bevindingen (met prioriteiten 1 en 2) ten opzichte van het aantal niet-urgente testbevindingen (met prioriteiten 3 en 4). Er worden dus minder testbevindingen gedaan en die zijn ook minder ernstig van aard. Dat het aantal bevindingen 'slechts' licht daalt is te verklaren doordat risico-gestuurd wordt getest. Elke volgende IKT-fase wordt met de testaanpak juist de complexiteit en de nieuw beschikbare functionaliteit in het DSO-stelsel 'opgezocht'.

Vervolg IKT-aanpak IKT-5 en verder

Ook IKT-5 zal weer bijdragen aan duidelijkheid en zekerheid over de werking van het DSO. De focus van IKT-5 zal liggen op de nieuw beschikbare functionaliteit in lokale software. Waarbij ook de verbeteringen in de landelijke voorziening getest zullen worden. Focus zal liggen bij de planketen.

De testcasuïstiek in de volgende IKT-fasen zal scherp gestuurd blijven in de richting waar de gesignaleerde risico's voor inwerkingtreding het hoogste zijn.

IKT 4 en de werkbaarheid van het DSO in relatie tot eisen inwerkingtreding

In het algemeen is door de IKT deelnemers ervaren dat de functionaliteit van het DSO (inclusief de TAM), zoals die per april 2023 beschikbaar was, werkbaar is en daarmee gereed is voor inwerkingtreding. Dat is daarmee een herbevestiging van de conclusie uit de fase-rapportage IKT 3. Meest in het oog springende verbeteringen zijn de integrale tekstvervanging in de Planketen bij de lokale softwareleveranciers en meerdere verbeteringen in de Viewer(s) van het Omgevingsloket.

Verbetermaatregelen naar aanleiding van advies AcICT

Ook in IKT-4 zijn de maatregelen naar aanleiding van de eerder door AcICT geformuleerde adviezen krachtig doorgezet. Meest in het oog springend zijn daarbij de verbeteringen in testregistratie, testtooling en testrapportages. In de vorm van een geslaagde 'proeftuin' is gewerkt aan deze verbetermaatregelen. Deze worden vanaf de start van IKT-5 in productie genomen.

Verder zijn analyses uitgevoerd met betrekking tot de dekking van de IKT-uitvoering voor wat betreft alle bevoegde gezagen. Testen bij een bevoegd gezag met een specifieke softwareleverancier zeggen indirect ook iets over andere bevoegd gezagen die ook software van deze leverancier gebruiken. Uit de eerste analyses blijkt dat door het representatief testen met deze groep van IKT-voorlopers het merendeel van alle bevoegd gezagen 'is afgedekt'.

Inhoud

Indringend Ketentesten (IKT) Fase 4—1

Samenvatting—1

Inhoud—4

Inleiding—6

1 Kwalitatieve duiding van resultaten IKT-4—10

1.1 Doelstellingen en aanpak IKT-4—10

1.1.1 Gemeenten—10

1.1.2 Provincies—10

1.1.3 Waterschappen—10

1.1.4 Rijk—11

1.2 Testresultaten planketen (stappen 1 tot en met 4)—11

1.2.1 Gemeenten—11

1.2.2 Provincies—14

1.2.3 Waterschappen—15

1.2.4 Rijk—16

1.3 Testresultaten Toepasbare-regels-keten (stappen 5 tot en met 7)—17

1.3.1 Gemeenten—17

1.3.2 Provincies—17

1.3.3 Waterschappen—17

1.4 Testresultaten vergunningenketen (stappen 8 tot en met 11)—18

1.4.1 Gemeenten—18

1.4.2 Provincies—19

1.4.3 Waterschappen—19

1.4.4 Rijk—20

1.5 Tijdelijke alternatieve maatregelen—21

1.6 Vervolg IKT-aanpak IKT-5 en verder—21

1.6.1 Gemeenten—21

1.6.2 Provincies—22

1.6.3 Waterschappen—22

1.6.4 Rijk—22

2 Testbevindingen IKT-4 in cijfers—23

2.1 Herkomst van bevindingen en wensen—24

2.2 Statusafhandeling bevindingen en wensen—24

2.3 Meldingen per prioriteit—25

2.4 Bevindingen per processtap—27

3 Trendanalyse geheel IKT (Fasen 1 tot en met 4)—28

3.1 Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding—28

3.2 Aantal meldingen in relatie tot aantal deelnemers—29

3.3 Verdeling bevindingen naar prioriteiten—29

4 Verbetermaatregelen in IKT-4—31

4.1 IKT-registratie, -tooling, en rapportages—31

4.2 Dekking IKT—31

BIJLAGE 1 De DSO keten in 11 stappen—33

BIJLAGE 2 Minimale functionele set en IKT-4—34

BIJLAGE 3 Maatregelen naar aanleiding van adviezen AcICT—37

BIJLAGE 4 Deelnemende organisaties IKT-4—40

BIJLAGE 5 Figuren en tabellen bij hoofdstuk 2—41

BIJLAGE 6 Figuren en tabellen bij hoofdstuk 3—50

Inleiding

Voor u ligt de Rapportage Indringend Ketentesten (IKT) Fase 4. Deze rapportage bevat de bevindingen vanuit het project Indringend Ketentesten (IKT) Fase 4 (verder te noemen IKT-4). In deze fase (testweek 18 tot en met 23 – van 16 januari tot 24 april 2023) is weer een niveau complexer en indringender getest dan in Fase 3. Het IKT-project (Fase 1) is oorspronkelijk gestart in april 2022.


Positionering IKT

IKT is van belang voor het aantonen of het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werkbaar is voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. In het IKT komt alle functionaliteit van het DSO samen en wordt in de praktijk getest of het DSO in functionele zin werkbaar is. Deze functionele werkbaarheid wordt aangetoond door het DSO te beproeven in het ondersteunen van de werkprocessen die relevant zijn voor bevoegd gezagen na inwerkingtreding.

Dat betekent dat de IKT-testen wordt uitgevoerd met complexe casuïstiek en gericht op de werkprocessen van de diverse betrokkenen uit de DSO keten als geheel. IKT is opgezet om de functionaliteit te testen en kijkt daarbij ook of bevoegd gezagen bij inwerkingtreding via het DSO hun taken en verantwoordelijkheden onder de Omgevingswet kunnen uitoefenen. Anders gezegd: ondersteunen de nieuwe functionaliteiten de nieuwe werkwijze in de DSO keten, zijn deze via IKT indringend getest, zijn eventueel aanwezige risico's in beeld en voorzien van mitigerende maatregelen? Dit betekent dat alle betrokken partijen nauw moeten samenwerken en zicht ontstaat op de werkbaarheid van het DSO.

In onderstaande figuur zijn de werkprocessen van het DSO weergegeven. Deze figuur is ook als vergrote weergave opgenomen in bijlage 1 Deze procesplaat is de leidraad voor alle bevoegd gezagen die deelnemen aan IKT: gemeenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen.

Figuur 1. Procesplaat DSO-keten in 11 stappen
 Zie Bijlage 1 voor een grotere weergave van deze figuur

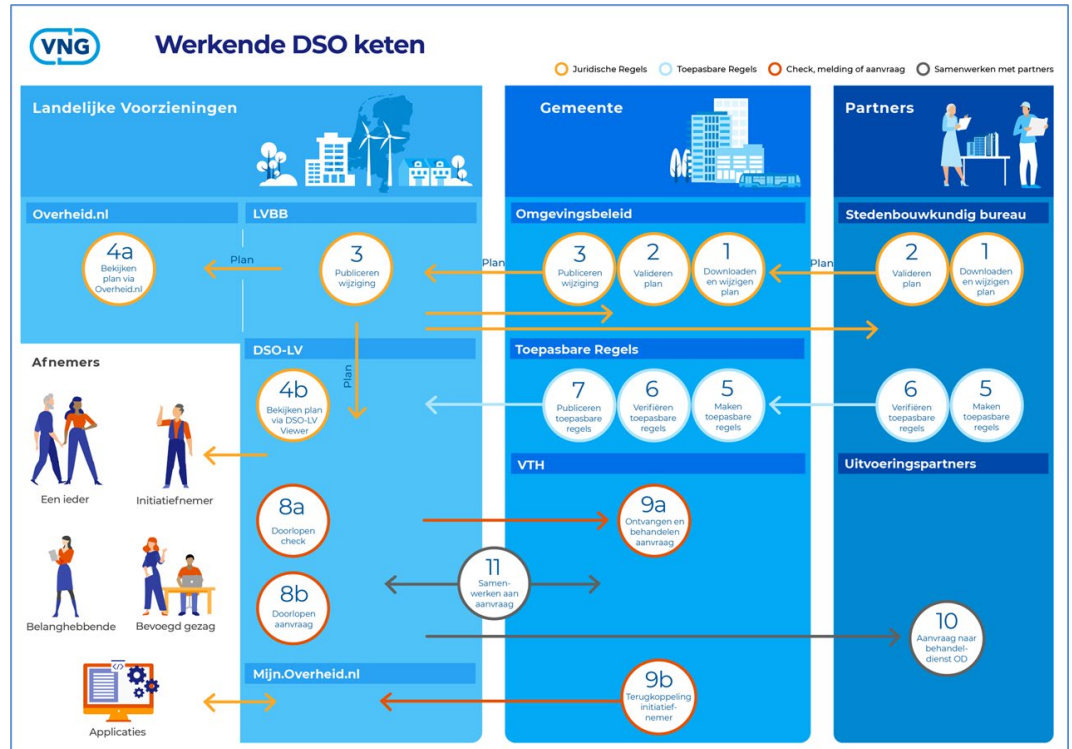

Ketentesten met en voor bevoegd gezagen

Uitgangspunt van het Indringend Ketentesten (IKT) blijft om vast te stellen wat er goed werkt in de gehele keten van het DSO en wat nog niet, uitgaande van de minimale vereisten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De testbasis voor IKT is de functionele set inwerkingtreding (zie hiervoor de functionele set op de website van Aan de slag met de Omgevingswet). Deze set komt voort uit samenwerkingsafspraken tussen vertegenwoordigers van stedenbouwkundige bureaus, de Geo-ICT branche en softwareleveranciers, samen met de koepels van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijk. Basis daarbij zijn de werkprocessen van de bevoegd gezagen: van planvorming tot aan afhandeling van aanvragen. Testbevindingen worden daarbij door betreffende ketenpartijen zo snel mogelijk opgepakt en opgelost.

AcICT en Axini

Op basis van de adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) is de bestaande testaanpak verstevigd via een concrete set van maatregelen.

Essentie van het advies van AcICT is dat dit zich richt op de gehele quality assurance (QA) van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) (zowel centraal, als decentraal), waardoor aanvullende zekerheid wordt verkregen dat de keten stabiel, betrouwbaar en werkbaar is bij inwerkingtreding.

Het AcICT geeft in zijn advies van 10 oktober 2022 een bredere beschouwing van de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) dan 'alleen' het interbestuurlijke ketentesten door middel van het project IKT. Er worden ook aanbevelingen gedaan ten aanzien van bijvoorbeeld de non-functionals of de testvoorzieningen van het DSO in algemene zin. Deze integrale verantwoordelijkheid

voor de kwaliteit van het DSO ligt primair bij het programma Aan de slag met de Omgevingswet – en is daar ook belegd – en niet bij het interbestuurlijke project IKT.

De voor u liggende rapportage betreft het interbestuurlijke project IKT, met de daarbij behorende scope. Bij de uitvoering van IKT-3 is een aantal maatregelen genomen, mede naar aanleiding van de adviezen van AcICT. Met de uitvoering van IKT-3 is daarmee al eerder een start gemaakt met de implementatie van de maatregelen op basis van het advies van AcICT van 10 oktober 2022. Bij de uitvoering van IKT-4 is de implementatie van de maatregelen als gevolg van de adviezen van AcICT verder doorgezet.

Op 28 november 2022 is door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) aan AcICT het verzoek gedaan tussentijds te adviseren over het Plan van Aanpak IKT Fase 3. Op 22 december 2022 heeft AcICT dit advies uitgebracht. De daarin verwoorde adviezen waren basis voor de verdere uitvoering van IKT-3 en IKT-4. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de stand van zaken van de genomen maatregelen als gevolg van de adviezen van AcICT.

Medio oktober 2022 is tevens externe testdeskundigheid (Axini) in de arm genomen om de DSO-organisatie en het interbestuurlijke IKT-project te versterken met aanvullende expertise op het vlak van quality assurance en testaanpak. Axini is een autoriteit in zijn (test-)vakgebied en heeft ruime kennis en ervaring met vergelijkbare grote ICT-ketenintegratie-projecten. Sinds oktober 2022 adviseert Axini het programma Aan de slag met de Omgevingswet over de te nemen kwaliteitsmaatregelen voor het DSO en IKT.

Door Axini is tijdens de uitvoering van IKT-4 in het bijzonder ondersteuning verleend bij het verbeteren van de IKT-registratie, -tooling en rapportages (dashboards). Zie hiervoor hoofdstuk 4.

Leeswijzer

De voor u liggende rapportage is als volgt opgebouwd.

In hoofdstuk 1 wordt een kwalitatieve beschrijving gegeven van de testbevindingen. De belangrijkste bevindingen en trends worden hier toegelicht. Basis hiervoor zijn de gedetailleerde testrapportages die per testweek al eerder zijn gepubliceerd op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Het IKT-project test de functionele werking van het DSO in relatie tot de werkprocessen van de bevoegde gezagen. Bevindingen die zeker relevant zijn maar niet tot deze focus behoren zijn bijvoorbeeld: gereedheid van een lokaal bevoegd gezag, juiste implementatie bij een bevoegd gezag, performance van het DSO, gebruikersvriendelijkheid van software-componenten. Dit zijn voorbeelden van zaken die elders binnen het programma zijn belegd. Genoemde type bevindingen worden wel door het IKT-project geregistreerd en doorgezet naar relevante partijen, maar in deze rapportage (hoofdstuk 1) worden deze bevindingen gelabeld als 'bijvangst'.

In de hoofdstukken 2 en 3 wordt een kwantitatieve beschrijving gegeven van de testbevindingen en een duiding gegeven van de trends die daar worden gezien. In hoofdstuk 2 wordt dat specifiek voor IKT Fase 4 gedaan. In hoofdstuk 3 wordt gekeken naar alle doorlopen IKT-fasen (1 t/m 4)

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op 2 specifieke verbetermaatregelen die zijn doorgevoerd in de manier van werken, gedurende IKT-4. Dit betreft enerzijds het verbeteren van de IKT-registratie, -tooling- en dashboards. En anderzijds een analyse van de dekking van IKT met betrekking tot de representativiteit van de IKT-testen voor alle bevoegde gezagen.

In de bijlagen is een nadere uitwerking opgenomen van:

1. De DSO-keten in 11 stappen en daarmee de scope van IKT
2. De minimale functionele set (de testnorm) in relatie tot IKT-4, maar ook de eerdere en toekomstige IKT-fasen
3. De status van de maatregelen naar aanleiding van de adviezen van AcICT
4. De deelnemende bevoegde gezagen en overige partijen aan IKT-4

Tot slot zijn in de bijlagen 5 en 6 opgenomen de figuren en tabellen horend bij respectievelijk de hoofdstukken 2 en 3. Deze zijn mede opgenomen vanwege de webrichtlijnen voor toegankelijkheid, in het bijzonder de internet(voor-)leesbaarheid van pdf-documenten.

1 Kwalitatieve duiding van resultaten IKT-4

1.1 Doelstellingen en aanpak IKT-4

1.1.1 Gemeenten

In IKT-4 hebben dertien gemeenten en twee omgevingsdiensten de keten beproefd aan de hand van business-scenario's. De focus deze fase lag op de gemeentelijke planketen, de interbestuurlijke planketen en de gehele DSO-keten. Daarnaast zijn enkele aanvullende testen uitgevoerd in de toepasbareregelketen en de vergunningketen. De meeste testen in deze twee ketens vonden al in eerdere IKT-fasen plaats. Als alle IKT-fasen samen worden genomen, dan zijn aan het einde van IKT-4 met alle grotere softwareleveranciers (met meer dan vier klanten in de gemeentemarkt) meerdere testen uitgevoerd. Ook voor IKT-4 is met de gemeenten weer gericht getest op basis van de in het Plan van Aanpak gestelde (risico-gebaseerde) doelen.

1.1.2 Provincies

Aan IKT-4 is deelgenomen door vijf provincies, waarvan er één provincie aan een of enkele testweken heeft deelgenomen en vier provincies aan het overgrote deel van de testweken. Vier van de vijf provincies hebben ook aan de eerdere IKT-ronden deelgenomen. Bij de start van IKT-3 is een inventarisatie gemaakt van risico's in de verschillende deelketens en die risico's zijn ook in fase 4 van IKT richtsnoer geweest voor het testen. Een testcoördinator van IPO begeleidt provincies bij de voorbereiding en uitvoering van het testen. De werkzaamheden zijn hiermee grotendeels conform Plan van Aanpak uitgevoerd.

1.1.3 Waterschappen

In totaal hebben acht waterschappen deelgenomen aan IKT-testen, waaronder ook twee die niet eerder hebben deelgenomen. Hiermee is de doelstelling om zes waterschappen deel te laten nemen en de dekking van in gebruik zijnde software te vergroten ruimschoots gehaald.

De doelstelling om te komen tot een meer risicogerichte aanpak is opgepakt door een extern bureau interviews uit te laten voeren bij waterschappen, softwareleveranciers en met personen van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. Dit heeft geleid tot een risico-set waarbij gezocht is naar risicobeperkende maatregelen en testscenario's om te beoordelen of risico's (nog) optreden. Deze testscenario's worden geïntegreerd met de bestaande scenario's die nu in het kader van IKT gebruikt worden.

Inmiddels vindt tweewekelijks een afstemming plaats met waterschappen die deelnemen aan de IKT-testen (of dat eerder hebben gedaan). Hierdoor wordt kennisuitwisseling gestimuleerd. Het voornemen om aan te sluiten bij regionale oefensessies heeft geleid tot een initiatief om een regionale oefenbijeenkomst (Haaglanden) te gaan benutten om hier IKT-testen plaats te laten vinden. De uitvoering hiervan vindt plaats in IKT-5.

De inhoudelijke doelstellingen die waren geformuleerd in het Plan van Aanpak, zijn gerealiseerd. Zie hiervoor volgende paragrafen.

1.1.4 *Rijk*

Aan IKT-4 is in de VTH-keten deelgenomen door Rijkswaterstaat (in samenwerking met Waterschap Limburg), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) (in samenwerking met provincie Zeeland en Utrecht) en ProRail. Er is gebruikgemaakt van een opgestelde risico-inventarisatie in de verschillende deelketens en die risico's zijn ook in fase 4 van IKT richtsnoer geweest voor het testen. Getest zijn meervoudige vergunningaanvragen en de Samenwerkfunctionaliteit (SWF). Conform de doelstelling voor deze periode is ook het eigen zaaksysteem betrokken geweest bij de testen. De werkzaamheden zijn hiermee grotendeels conform Plan van Aanpak uitgevoerd.

Het Serviceteam Rijk (STR) heeft voorbereidingen getroffen om een IKT-test voorbereidingsbesluit hyperscale datacenter uit te voeren. Afstemming met deelnemende gemeenten en KOOP vergde evenwel meer tijd dan gedacht, zodat de daadwerkelijke IKT-test nog niet heeft plaatsgevonden.

1.2 **Testresultaten planketen (stappen 1 tot en met 4)**

De planketen betreft het downloaden, wijzigen en publiceren van omgevingsinstrumenten: omgevingsvisie, omgevingsverordening, omgevingsplan, waterschapsverordening en het programma. Het betreft een keten die start bij de gemeente, waterschap of provincie en/of een stedenbouwkundig bureau en doorloopt naar de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) en de landelijke voorziening van DSO (DSO-LV).

Verwezen wordt naar de stappen 1 tot en met 4 uit de procesplaat *DSO-keten in 11 stappen*, zoals opgenomen in bijlage 1.

1.2.1 *Gemeenten*

In IKT-4 is de planketen met drie grote plansoftware leveranciers beproefd. De planleverancier waarbij de software in de eerdere IKT-fasen nog niet gereed was, neemt inmiddels ook deel aan IKT. Vanuit de gemeenten bezien zijn er vier grote plansoftware-leveranciers (minimaal vier gemeenten als klant). Met de vierde leverancier zijn in eerdere IKT-fasen alle planketen-business-scenario's doorlopen. Om deze reden heeft deze leverancier deze fase niet deelgenomen. Hiermee zijn alle op dit moment beschikbare functionaliteiten in een test beproefd.

De bevindingen die in de testen zijn gedaan, worden hieronder beschreven.

Functionaliteiten planketen

- *Lokale plansoftware*: in de planketen ontbraken tijdens IKT-4 bij de meeste leveranciers nog belangrijke software-functionaliteiten (waaronder de plan-plan-uitwisseling, parallelle wijzigingen en tonen van het plan aan de Raad). Deze functies zijn derhalve nog niet getest in IKT-4 en zullen in een latere IKT-ronde worden getest. Hierdoor is in IKT-4 een deel van de DSO-planketen getest. De planleveranciers hebben stappen gezet wat betreft de wijze van muteren: alle leveranciers ondersteunen de voor inwerkingtreding (IWT) benodigde 'integrale tekstvervanging'. Voor de volledigheid: in eerdere IKT-fasen is reeds de planketen met het TAM-omgevingsplan beproefd. Deze dient als vervanging voor de nog ontbrekende functionaliteit.
- *Landelijke voorziening*: met betrekking tot de landelijke voorziening zijn alle functies opgeleverd, maar wordt een aantal functies nog verbeterd (met als belangrijkste de DSO-LV viewers met het tonen van het ontwerp en tijdreizen).

Succesvol kunnen downloaden omgevingsplannen

In de vorige IKT-fase is met gemeente Waalre een eerder gepubliceerd omgevingsplan van de gemeente bij de landelijke voorziening gedownload. De downloadfunctie werkte. In deze fase is met een andere softwareleverancier eveneens de downloadfunctie beproefd waarbij ook bleek dat de functie naar behoren werkte.

Wijzigen, valideren en publiceren

Met de drie softwarepakketten zijn verschillende wijzigingen voor zowel omgevingsplannen als omgevingsvisies in de software voorbereid en gepubliceerd bij de LVBB. Nieuw hierbij in IKT-4 was dat alle leveranciers de 'integrale tekstvervanging mutatie' ondersteunen. De testen met deze nieuwe manier van wijzigen verliepen in de meeste gevallen uiteindelijk positief.

In de gevallen waarbij het niet goed ging, zijn de bevindingen:

- *Mislukte publicatie, toepasbare regels verdwenen*: bij een gemeente ontstond een issue toen de publicatie halverwege het proces mislukte. Zoals ook de provincies ondervonden, zorgde een mislukte publicatie van juridische regels voor het niet meer beschikbaar zijn van toepasbare regels en daarmee de vragen in het Omgevingsloket. De provincies ondervonden hetzelfde issue. Voor een verdere uitleg van deze bevinding, zie de onderstaande alinea 'wijzigen, valideren en publiceren' in de tekst van de provincies.
- *Meldingen validatiefouten*: zoals ook de provincies verder in deze rapportage concluderen zijn de foutmeldingen die de LVBB teruggeeft voor 'gewone gebruikers' van de plansoftware niet altijd te begrijpen. Er zijn hierbij verschillen per leverancier hoe wordt omgegaan met de foutmeldingen. Eén leverancier biedt de gebruiker een 'vertaling' van de foutmelding, een ander toont de melding 'neem contact op met de leverancier' en de laatste leverancier toont letterlijk de door de landelijke voorziening (LVBB) geleverde tekst. Het gevolg is dat, bij het ontstaan van een validatiefout, de gebruiker van de plansoftware in veel gevallen niet verder kan zonder hulp van de softwareleverancier en/of de specialisten van de landelijke voorziening. Content: omgevingsinstrumenten, inhoudsvarianties, omgevingsplan-stadia.

Tijdens de gemeentelijke IKT-4 testen zijn voorbereidingsbesluiten (wijzigingen van het omgevingsplan met voorbeschermingsregels), omgevingsplannen (wijzigingsbesluiten van het omgevingsplan) en omgevingsvisies gemaakt en gepubliceerd.

Per instrument zijn de belangrijkste bevindingen:

- *Omgevingsvisie*: met de gemeente Eindhoven zijn meerdere wijzigingen aan de omgevingsvisie gepubliceerd. Bij één publicatie was hulp nodig van de leverancier bij het duiden van een melding van een validatiefout, waarna de wijziging alsnog succesvol kon worden gepubliceerd (zie ook bovenstaande bevinding met betrekking tot validatiefouten). Ook was een wijziging niet direct zichtbaar op officiële bekendmakingen. Dit is door de specialisten bij de landelijke voorzieningen opgelost. Uiteindelijk werden de wijzigingen correct getoond.
- *Vorbereidingsbesluit*: meerdere gemeenten hebben succesvol voorbereidingsbesluiten gepubliceerd. Bij de gemeente Deventer ontstond een onverwachte situatie waarbij een voor de volgende dag geldend voorbereidingsbesluit werd gekoppeld aan een in de verdere toekomst inwerkingtredende wijziging van het omgevingsplan. Dit wordt nog onderzocht.
- *Wijzigingen omgevingsplan en planstadia*: voor het omgevingsplan is specifiek aandacht besteed aan inhoudsvarianties van het omgevingsplan. Hierbij worden in

een plan bewust allerlei variaties in de inhoud van het plan aangebracht waarbij enerzijds getest wordt of de plansoftware de mogelijkheid biedt om de variatie aan te brengen en anderzijds wordt bekeken hoe de variaties doorwerken in de rest van de planketen (validatie, publicatie en bekijken in de diverse viewers). Hierbij zien we dat niet alle variaties door iedere leverancier worden ondersteund, maar dat de belangrijkste variaties voor IWT wel beschikbaar zijn. Het publiceren van inhoudsvarianties werkte naar behoren.

- Door gemeente Leidschendam-Voorburg is een test uitgevoerd waarbij de gemeente in twee weken tijd zes publicaties van (ontwerp-) wijzigingen deed waarbij enkele in de toekomst. Alle publicaties werden goed verwerkt en waren correct terug te zien in de DSO-LV-viewers.

Viewers en tijdreizen

Binnen IKT-4 zijn de door de dertien gemeenten gepubliceerde plannen bekeken in zowel de viewer van officiële bekendmakingen (LVBB) als de DSO-LV-viewers Regels op de kaart en de Viewer Documenten op de kaart.

- *Doorlooptijden*: de regeling en werkingsgebieden verschijnen nu gezamenlijk de dag na publiceren: een duidelijke verbetering. Echter de doorlooptijden verschilden nog per publicatie. In IKT-4 zijn meerdere publicaties achter elkaar gedaan om te zien wanneer welke versie in de Viewer Regels op de kaart getoond zou worden. Volgens de afspraak zou bij een publicatie 'vandaag' in de plansoftware de regeling een dag later binnen 2-4 uur te zien moeten zijn in Viewer Regels op de kaart, vanaf 9 uur 's morgens gerekend. Een aantal keer is vastgesteld dat dit langer duurde. In uitzonderlijke gevallen zelfs nog 24 uur later.
- *Gebruiksvriendelijkheid*: de gemeenten zagen daarbij wel kleine issues met betrekking tot de gebruiksvriendelijkheid en de manier van weergeven van het plan. Zo werden normen op de kaart nog over elkaar getoond. Daarnaast werd bevonden dat gepubliceerde ontwerpen blijven bestaan ook na het publiceren van het definitieve omgevingsplan. Daarbij hebben de ontwerpen een wat prominente plek in de lijst, wat door de gemeenten als minder gebruiksvriendelijk is ervaren. De landelijke voorziening en de koepels zijn in gesprek over deze bevindingen. Verbeteringen aan de viewer worden daarbij constant doorgevoerd.
- *Tijdreizen*: het is mogelijk om in de viewer de gepubliceerde versies van het omgevingsplan als geheel (de complete regeling) op verschillende momenten in de tijd te bekijken. Het tijdreizen naar de toekomst werkte nog niet. Gemeenten geven daarbij aan dat ze uitgebreidere functionaliteit hadden verwacht waarbij het eenvoudiger is om te zien wat er exact is gewijzigd in het omgevingsplan, op welk moment en op een specifieke locatie.

Samenhang juridische en toepasbare regels

In IKT-4 is met een aantal gemeenten de samenhang tussen juridische en toepasbare regels getest als onderdeel van de DSO-ketentest. In de happy flow van het publiceren van juridische regels en vervolgens de bijbehorende toepasbare regels zijn geen issues naar voren gekomen. Specifiek is er ook onderzocht wat er gebeurt als juridische en toepasbare regels worden gewijzigd tijdens een lopende vergunningaanvraag, waarbij de indiener nog een aanvulling indient. De gemeente was hierbij benieuwd naar de gevolgen van het wijzigen van de regel voor een lopende aanvraag. Geconstateerd werd dat de aanvraag gewoon kon worden voortgezet op basis van de regels die golden op het moment van aanvragen.

Interbestuurlijke planketen

In deze fase is bij twee provincies en met meerdere gemeenten de interbestuurlijke planketen beproefd. De twee provincies hebben beide een voorbereidingsbesluit gepubliceerd met een tijdelijk regelingdeel voor in totaal vier gemeenten. Het regelingdeel werd bij drie gemeenten zichtbaar bij het meest recente vastgestelde omgevingsplan. Bij één gemeente werd het tijdelijk regelingdeel niet getoond bij het meest recent vastgestelde omgevingsplan. Dit wordt nog onderzocht. Verder werden enkele wensen geuit met betrekking tot de wijze waarop het tijdelijk regelingdeel in de Viewer Regels op de kaart wordt getoond.

1.2.2

Provincies

Zes provincies hebben deelgenomen aan het testen van de planketen en daarbij zijn de beide softwareleveranciers die bij provincies voorkomen, geraakt.

Functionaliteiten planketen

- *Decentrale plansoftware*: provincies kunnen nog niet beschikken over alle functionaliteiten die nodig zijn voor inwerkingtreding. Enerzijds zijn specifieke provinciale instrumenten nog niet geïmplementeerd, zoals de reactieve interventie en instructie. Anderzijds ontbreken nog functionaliteiten, zoals de basismutaties, functionaliteit voor het werken met omgevingsnormen en -waarden en functionaliteit voor de uitwisseling van plannen. Uiteraard betekent het nog niet beschikbaar zijn van deze functionaliteiten in de decentrale plansoftware ook dat de daarmee samenhangende functionaliteit in de landelijke voorziening nog niet indringend kan worden getest.
- *Landelijke voorziening*: in de landelijke voorziening werkt nog niet alle functionaliteit zoals beoogd of verwacht voor inwerkingtreding. Dit betreft bijvoorbeeld de functionaliteit voor het raadplegen van ontwerpregelingen in de viewers en de functionaliteit voor tijdreizen naar de toekomst.

Deze functionaliteiten zijn dus niet of niet volledig getest in IKT-4.

Wijzigen, valideren en publiceren

Provincies hebben met verschillende instrumenten – zie de volgende paragraaf over Content – het opstellen, wijzigen, valideren en publiceren getest. Hoewel het publiceren met elk instrument uiteindelijk altijd wel lukte, waren er vaak meerdere pogingen nodig voordat een publicatie succesvol was en doorgaans was daarvoor ondersteuning van de softwareleverancier nodig. De foutmeldingen die het DSO-LV teruggeeft, zijn voor 'gewone gebruikers' van de plansoftware niet altijd te begrijpen en met enige regelmaat trad ook de 'onbekende fout' (BHKV9999) op. In die gevallen moest vrijwel altijd een beroep worden gedaan op specialisten van DSO-LV om te achterhalen wat er in dat specifieke geval niet goed ging.

Door de wijze van muteren in een van de plansoftwareapplicaties traden regelmatig onbedoelde neveneffecten op als een publicatie niet volledig slaagde. Bij het uitvoeren van een mutatie met 'integrale tekstvervanging' worden eerst alle Omgevingswetobjecten van de oorspronkelijke publicatie beëindigd met directe mutaties en vervolgens weer opnieuw gepubliceerd samen met de (tekst van de) nieuwe regeling. Echter, als de eerste stap (het beëindigen van Omgevingswetobjecten) wel slaagt, maar de tweede stap (het integraal vervangen van de tekst van de regeling en het opnieuw aanleveren van, al dan niet gewijzigde, Omgevingswetobjecten) niet, dan staat er niet alleen geen regeling in het DSO-LV, maar ontbreken ook de Omgevingswetobjecten. Omdat belangrijke objecten als activiteiten en werkingsgebieden zijn beëindigd, functioneren dan ook de toepasbare regels voor de check en indieningsvereisten niet meer en is het dus niet meer

mogelijk vergunningaanvragen in te dienen of meldingen te doen. De gemeenten die met deze plansoftware werken, constateerden hetzelfde. De leverancier is uiteraard bekend met het probleem en werkt aan het oplossen ervan.

Content: omgevingsinstrumenten, inhoudsvarianties en planstadia

Provincies hebben in IKT-4 getest met omgevingsverordeningen, voorbereidingsbesluiten, projectbesluiten en programma's. Daarnaast is de tijdelijke alternatieve maatregel (TAM) voor het Voorbereidingsbesluit getest.

Omgevingsverordening: provincies hebben veelvuldig getest met het opstellen en publiceren van hun belangrijkste omgevingsinstrument, de omgevingsverordening. Voor initiële publicaties en mutaties op basis van integrale tekstvervanging geldt dat deze in de loop van IKT-fase 4 tot steeds minder, maar nog wel tot een beperkt aantal bevindingen leiden.

Daarnaast zijn provincies gaan testen met het opstellen van *wijzigingsbesluiten* ten behoeve van ontwerp-omgevingsverordeningen. Onderdeel hiervan is het opstellen van een wijzigingsbesluit met ondersteuning van de renvooiservice. De ervaringen met de renvooiservice zijn positief. Ten aanzien van de weergave van ontwerp-regelingen in de viewers van het DSO-LV zijn er nog relatief veel (veelal kleinere) bevindingen.

- *Voorbereidingsbesluit:* een aantal provincies heeft getest met voorbereidingsbesluiten met meervoudige tijdelijke regelingdelen die zien op omgevingsplannen van gemeenten in de provincie. Hierbij is een beperkt aantal bevindingen geconstateerd, waarvan de voornaamste was dat de meervoudige tijdelijke regelingdelen niet bij alle omgevingsplannen werden getoond in de viewers.
- *Projectbesluit:* twee provincies hebben getest met het opstellen en publiceren van een projectbesluit. De voornaamste bevindingen hebben betrekking op een incomplete en soms onjuiste weergave van onderdelen van het projectbesluit in de viewers.
- *Programma:* twee provincies hebben getest met het opstellen en publiceren van een programma. Dit is succesvol verlopen, er zijn geen bevindingen geconstateerd.

1.2.3 Waterschappen

Algemeen

De functionaliteit om waterschapsverordeningen (WSV) te publiceren is in eerdere fasen van IKT uitgebreid getest. Dit werkt over het algemeen naar behoren. Het grootste knelpunt dat hier nog bestaat, betreft de onmogelijkheid om plannen met zeer omvangrijke geometrieën te kunnen publiceren. Zeer omvangrijk wordt hier bedoeld als: omvangrijker dan eerder als een realistisch ingeschatte limiet is ingesteld. Bij de bepaling van die limiet heeft ook een afweging plaatsgevonden in relatie tot (mogelijk verminderde) performance bij zeer omvangrijke bestanden. De meeste waterschappen kunnen uit de voeten met deze begrenzing. De oplossing om deze bestanden te verkleinen wordt op dit moment door een tweetal waterschappen nog niet aanvaard als een werkbare oplossing. Hierover vindt nog overleg plaats tussen betrokken partijen.

Voor waterschappen is de WSV het belangrijkste plan. Het is de intentie van alle waterschappen om geen gebruik te gaan maken van alternatieve oplossingen (TAM). Naast de waterschapsverordening is het projectbesluit relevant. Hier zijn in deze ronde de eerste publicaties van gedaan. De functionaliteit voor het projectbesluit

aan de plan-kant is in deze periode door een leverancier afgerond. Het is de bedoeling om hier in een volgende ronde een verdieping in testen uit te voeren.

Publicatie van plan-inhoud

In de planketen zijn in deze ronde - conform Plan van Aanpak- testen uitgevoerd waarbij werd nagegaan of waterschapsverordeningen op een juiste wijze werden getoond in de Viewer Regels op de kaart.

In het algemeen kan gesteld worden dat deze viewer juist werkt. Opgemerkt is dat publicaties van wijzigingen juist worden doorgevoerd. Voor regels wordt ook duidelijk gemaakt wat de wijzigingen waren. Er is echter geen functionaliteit beschikbaar die inzichtelijk maakt welke geometrische wijzigingen zijn aangebracht. Dit wordt als een gemis ervaren en is als wens ingebracht.

Aansluiting van besluitvorming op functionaliteit om te publiceren

Meerdere waterschappen hebben het proces gevolgd om van een ontwerp-plan, via wijzigingen daarin, te komen tot een definitief te publiceren plan. Daarbij is ook beoordeeld wat het betekent voor het besluitvormingsproces. Wie kan wat op basis waarvan besluiten en hoe is voor geïnteresseerde burgers en bedrijven inzichtelijk wat er in een bepaalde besluitvormingsfase wordt voor-/vastgesteld?

Het blijkt dat de inrichting van een dergelijk proces nog de nodige uitwerking behoeft. In technische zin konden de verschillende stappen allemaal goed uitgevoerd worden.

1.2.4

Rijk

De Rijkspartijen hebben aangegeven de benodigde IWT-functionaliteiten voor de plan tot publicatie keten in de systemen nu te kunnen gebruiken en ook al te gebruiken voor bijvoorbeeld de bekendmaking van (wijzigingen op) de Omgevingsregeling (Or) en het laden van de algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) en Or op de pre-productieomgeving. Wel gaat dit nog niet volgens het beoogde werkproces en hanteert het Rijk in samenwerking met zijn softwareleverancier en de ketenpartners KOOP/DSO een aantal (handmatige) workarounds. Dit betreft bijvoorbeeld het buiten de LVBB om consolideren van de rijksregelgeving en het niet-automatisch uitleveren van geconsolideerde versies vanuit de LVBB aan wetten.nl, omdat de LVBB beide nog niet ondersteunt. Dit heeft nadelen op het gebied van doorlooptijd, robuustheid en beheer. Daarom wordt enerzijds aan de kant van het Rijk het werkproces dit najaar geoptimaliseerd met behulp van ondersteunende software en anderzijds aan de LVBB/DSO-kant gewerkt aan functionaliteit om rijksconsolidatiescenario's te ondersteunen (na IWT verwacht).

Het Rijk heeft in IKT-4 geen testen in de planketen in IKT-verband uitgevoerd. Vermeldenswaard is dat het Rijk wel anderszins testen heeft uitgevoerd en voorbereidingen voor IKT-testen heeft getroffen. In de testperiode zijn alle bij het Rijk bekende openstaande issues in de categorieën laag, midden en hoog opnieuw door het Rijk getest of – in het geval van nieuwe bevindingen – bij IPLO gerapporteerd. Vooral de issues in de categorie hoog zijn voor het Rijk van belang om nog voor IWT opgelost te hebben. Deze betreffen met name de Omgevingsregeling, AMvB's, projectbesluit en programma. Door IKT is een hertest uitgevoerd (op de test van september 2022) van een selectie van de door het Rijk gebruikte omgevingsdocumenten AMvB, omgevingsregeling, projectbesluit en programma in de DSO-viewer. De uitkomst is dat er bevindingen zijn die nog opgelost moeten worden, maar in deze fase nog niet kunnen worden afgesloten,

omdat hiervoor door het Programma DSO nog aanvullende functionaliteiten moeten worden gerealiseerd.

1.3 Testresultaten Toepasbare-regels-keten (stappen 5 tot en met 7)

Verwezen wordt naar de stappen 5 tot en met 7 uit de procesplaat *DSO-keten in 11 stappen*, zoals opgenomen in bijlage 1.

1.3.1 Gemeenten

De meeste specifieke testen van de keten van toepasbare regels (TR) zijn in eerdere IKT-fasen uitgevoerd. In IKT-4 heeft één specifieke TR-ketentest plaatsgevonden. De andere testen met TR-software vonden plaats als onderdeel van een DSO-ketentest waarbij de gehele keten van juridische regels tot vergunningverlening werd doorlopen. Hierbij is ingezoomd op de relatie tussen juridische en toepasbare regels. Daarnaast is in IKT-4 een test uitgevoerd met de uitwisselbaarheid van toepasbare regels (STTR-bestanden) tussen de verschillende TR-softwareleveranciers. Hiermee zijn na IKT-4 TR-ketentesten uitgevoerd met de pakketten van de vier grotere softwareleveranciers voor toepasbare regels, waarbij alle business-scenario's voor TR zijn doorlopen.

Uit de IKT-testen zijn daarmee geen grote bevindingen naar voren gekomen waaruit blijkt dat de TR-keten technisch gezien niet werkt.

De volgende twee bevindingen zijn relevant:

Uit IKT-4 is, 'als bijvangst', naar voren gekomen dat – naast het technische aspect – het werken met toepasbare regels de nodige kennis en inzichten vraagt aan de zijde van de gemeenten.

Het importeren van toepasbare regels die gemaakt zijn door een ander bevoegd gezag met een andere leverancier, gaat niet altijd goed. De betrokken softwareleveranciers zijn op dit gebied verbeteringen aan het doorvoeren. Hiermee wordt echter het idee van toepasbare regels als herbruikbare open data momenteel maar beperkt bereikt.

1.3.2 Provincies

Provincies hebben getest met het opstellen en publiceren van toepasbare regels en hebben daarbij geen technische beletsels geconstateerd. Wel is er één bevinding ('bijvangst') geconstateerd die raakt aan de gebruiksvriendelijkheid voor aanvragers, namelijk dat als toepasbare regels worden gewijzigd, de antwoorden die al waren gegeven door een initiatiefnemer op basis van de vorige versie van de toepasbare regels, worden verwijderd.

1.3.3 Waterschappen

Er is opnieuw vastgesteld dat het van groot belang is om goed de relatie te bewaken tussen de toepasbare regels die worden opgesteld, en de juridische regels die worden vastgelegd. Primair is dat een verantwoordelijkheid van de bevoegd gezagen zelf.

Eén waterschap heeft vastgesteld dat er performance-issues optreden bij het gebruik van omvangrijke Geo-data in de toepasbare-regel-software. Hiervoor zoekt de betreffende leverancier naar een oplossing. Rijk

Door de rijkspartijen zijn in IKT-4 geen specifieke testen uitgevoerd met betrekking tot toepasbare regels.

1.4 Testresultaten vergunningenketen (stappen 8 tot en met 11)

De vergunningenketen loopt van het DSO-LV-Omgevingsloket (check en aanvraag) naar de VTH-software van het bevoegd gezag dan wel de omgevingsdienst, waarbij eventueel ook gebruik wordt gemaakt van de Samenwerkfunctionaliteit (SWF). Interbestuurlijk is de vergunningenketen al tijdens IKT Fase 2 beproefd.

Verwezen wordt naar de stappen 8 tot en met 11 uit de procesplaat *DSO-keten in 11 stappen*, zoals opgenomen in bijlage 1.

1.4.1 Gemeenten

Bijna alle benodigde functionaliteiten waren ten tijde van IKT-3 al beschikbaar. De meeste testen zijn dan ook in eerdere IKT-fasen uitgevoerd. Tijdens IKT-4 is daarom slechts een beperkt aantal testen uitgevoerd in de vergunningenketen. Daarnaast is de keten in breder verband getest binnen de gehele DSO-keten. Kijkend naar alle IKT-fasen dan zijn aan het einde van IKT-4 voor de gemeenten zo goed als alle business-scenario's voor de vergunningenketen doorlopen met de vijf grote softwareleveranciers.

Uit de IKT-testen zijn daarmee geen grote bevindingen naar voren gekomen waaruit blijkt dat de VTH-keten technisch gezien niet werkt. Anders dan een storing in het berichtenverkeer (tijdens testweek 24) waardoor ingediende aanvragen niet bij het bevoegd gezag aankwamen. Dit issue is snel opgelost. IKT-4 is op dit punt daarmee succesvol doorlopen. Het is mogelijk gebleken om de meest voorkomende typen meldingen en (meervoudige) aanvragen te doen in het Omgevingsloket waarna de gemeente of de omgevingsdienst deze in behandeling kan nemen. Waarbij ook functies als 'samenwerking met andere bevoegd gezagen', 'aanvullen en intrekken' en 'doorsturen' met succes zijn getest.

Net als eerder in de IKT-3-rapportage gesteld, dienen ook na IKT-4 weer twee zaken te worden opgemerkt die we onderstaand als 'bijvangst' in IKT constateren.

Inrichting software en werkprocessen

Issues die tijdens IKT-4 zijn bevonden, zijn te herleiden tot een onjuiste configuratie in de lokale software. Zowel wat betreft het verlenen van vergunningen als het samenwerken met andere organisaties. Met hulp van de leverancier zijn deze issues vaak snel opgelost. We constateren veel variatie in de door gemeenten gebruikte systemen (zowel voor wat betreft leverancier als in type software: zoals een specifiek VTH-systeem of een generiek ingezet zaakstelsel). Hierdoor is het inrichten (configureren) van de software vaak 'maatwerk' per gemeente of omgevingsdienst. Daarbij blijven we constateren dat het inrichten van de werkprocessen en het maken van werkafspraken bij de betrokken gemeenten en omgevingsdiensten significant tijd kost.

Gebruiksvriendelijkheid en verbeteringen

Tijdens het testen van de vergunningenketen werden door de testende gemeenten regelmatig zorgen geuit over de gebruiksvriendelijkheid en werden verbeteringen voorgesteld, zowel voor het Omgevingsloket als voor de lokale software. Het beproeven van gebruiksvriendelijkheid is geen onderdeel van IKT, maar wel van belang voor een goed bruikbaar stelsel. Ook deze bevindingen worden geregistreerd en teruggekoppeld naar de juiste behandelaar.

1.4.2 *Provincies*

Omdat nagenoeg alle functionaliteit in de keten voor vergunningverlening al geruime tijd beschikbaar is, is deze door provincies al vrij uitgebreid in eerdere IKT-fasen getest. Uit de testen in IKT-4 zijn geen bevindingen ten aanzien van de technische werking van het DSO gekomen: checks en aanvragen functioneren technisch goed en aanvragen en meldingen worden ontvangen in de VTH-applicatie of het zaakstelsel van de provincie.

Wel zijn er – net als bij gemeenten en waterschappen – ook bij provincies twee onderwerpen waar provincies bevindingen op rapporteren (de eerder genoemde 'bijvangst').

Inrichting software en werkprocessen

De software waarmee provincies de processen in het VTH-domein ondersteunen, functioneert nog niet in alle gevallen zoals gewenst of verwacht. Het gaat dan doorgaans om een niet juiste of optimale configuratie van de VTH-applicatie. Tijdens fase 4 van IKT zijn enkele bevindingen aan de leveranciers van decentrale VTH-software doorgegeven, uiteenlopend van functionele wensen tot een enkele 'bug'.

Gebruiksvriendelijkheid en verbeteringen

Net als andere bestuurslagen hebben provincies vooral bevindingen ten aanzien de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket. Een relatief veel bevindingen gaan over het moeilijk kunnen opgeven van de locatie waar een activiteit zal plaatsvinden, bijvoorbeeld als het gaat om een plek langs een provinciale weg of een traject/tracé van bijvoorbeeld kabels en leidingen. Ook in deze IKT-fase zijn weer bevindingen geconstateerd die betrekking hebben op het onderscheid tussen werkzaamheden tijdens de check en activiteiten tijdens het opstellen van een aanvraag of melding. Enerzijds is de lijst met werkzaamheden nog niet volledig in de ogen van provincies en anderzijds merken provincies dat het overstappen van de check (gebaseerd op werkzaamheden) naar een aanvraag (gebaseerd op activiteiten) niet altijd soepel verloopt.

1.4.3 *Waterschappen*

Inrichting software en werkprocessen

Omdat er een aantal waterschappen is toegevoegd met nog niet eerder bij IKT betrokken softwareleveranciers, zijn de nodige testcases uitgevoerd in de vergunningketen. Knelpunten die hier naar voren kwamen, zitten met name in het goed overnemen van gegevens en documenten uit het aanvraagproces. Hier zijn nog slechts enkele relevante bevindingen naar voren gekomen die voortkomen uit het functioneren van de landelijke voorziening van het DSO. In het algemeen loopt de verwerking inmiddels goed. Wel blijkt dat bij waterschappen die voor het eerst participeren in IKT, nog inrichtings-knelpunten naar voren komen. Hieruit blijkt de noodzaak voor een goede voorbereiding en toets. Deze knelpunten komen inmiddels veel minder voor bij waterschappen die al eerder aan IKT deelnamen.

Gebruiksvriendelijkheid en verbeteringen

Er zijn bij een aantal waterschappen testen uitgevoerd om het aanvraagproces te beoordelen. Hierbij is ook de werking van het Omgevingsloket beoordeeld. Er zijn op dit vlak geen serieuze knelpunten meer vastgesteld, maar er zijn wel verschillende voorstellen gedaan ter verduidelijking van de werking.

Ook zijn er voorstellen gedaan in de richting van VTH-leveranciers. Denk daarbij aan het inzichtelijk maken van wijzigingen die zijn gedaan bij een aanvraag.

Samenwerken

Een waterschap heeft complexere samenwerkingszaken met een gemeente beproefd. In het algemeen kan gesteld worden dat de Samenwerkfunctionaliteit goed functioneert. Wel zijn er zaken naar voren gekomen waar nog een oplossing voor moet worden gevonden.

In de samenwerking met een gemeente is bijvoorbeeld geconcludeerd dat het mogelijk was om een aanvraag af te sluiten, terwijl er nog een actieverzoek was uitgezet. Dit heeft tot gevolg dat in het DSO bij afgesloten aanvragen nog zichtbaar is dat er actieverzoeken openstaan.

Ook zijn enkele niet-kritische verbetervoorstellen opgesteld voor VTH-applicatieleveranciers. Deze testbevindingen zijn doorgezet naar de lokale software-leveranciers.

1.4.4

Rijk

Rijkswaterstaat (in samenwerking met Waterschap Limburg), RVO (in samenwerking met provincie Zeeland en Utrecht) en ProRail hebben in deze periode testen uitgevoerd. De business-scenario's betroffen enkelvoudige en meervoudige aanvragen met meerdere betrokken bevoegd gezagen. Ook is de Samenwerkfunctionaliteit getest.

Alle opgedane bevindingen zijn geregistreerd in TMR. De belangrijkste opgedane bevindingen die betrekking hebben op de VTH-systemen van de betrokken bevoegd gezagen, zijn hieronder vermeld:

Inrichting software en werkprocessen

Het VTH-loket werkt grotendeels naar behoren. Geconstateerde bevindingen hebben, onder andere, betrekking op het automatisch verwijderen uit het VTH-systeem van ingetrokken verzoeken, antwoorden op participatie die niet worden getoond, en op de Samenwerkfunctionaliteit die niet meer kan worden heropend na het sluiten ervan.

Gebruiksvriendelijkheid en verbeteringen

Er is een aantal testen uitgevoerd om het aanvraagproces te beoordelen. De bevindingen rond gebruikersvriendelijkheid zijn weliswaar te beschouwen als 'bijvangst' van het IKT-proces, maar bieden wel mogelijkheden tot verbetering van het systeem. Verbeteringen betreffen, onder meer, dat aangegeven wordt wat de wijzigingen zijn van een aanvulling op een verzoek in het VTH-systeem, welke antwoorden zijn gewijzigd na het ontvangen van een aanvulling op een eerder ontvangen verzoek en welke documenten zijn verwijderd of juist toegevoegd in een aanvulling.

Een andere bevinding is dat een rijkspartij nu niet wordt geïnformeerd wanneer een relevante aanvraag is ontvangen door een ander bevoegd gezag. Een tijdelijke oplossing wordt hiervoor nu toegepast via Daf (DSO-activiteitenfilter). Hiermee krijgt de rijkspartij inzicht in bij andere bevoegd gezagen ingediende aanvragen.

Een andere bevinding heeft betrekking op het informeren van initiatiefnemers. De initiatiefnemer zou geïnformeerd moeten worden wanneer zijn/haar aanvraag is doorgestuurd naar een ander bevoegd gezag en een ontvangstbevestiging dient te worden toegestuurd bij het doorsturen van een aanvraag. Verder zou het mogelijk

moeten zijn om een toelichting toe te voegen bij het doorsturen van een aanvraag naar een ander bevoegd gezag. En bijlagen moeten als vertrouwelijk kunnen worden aangeleverd na wijzigen van de locatie van de nieuwe aanvraag. Informatie betreffende participatie zou moeten kunnen worden getoond in het VTH-systeem.

1.5 Tijdelijke alternatieve maatregelen

Er zijn tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) voor bevoegd gezagen beschikbaar die bij de voorbereiding en inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen gebruik kunnen maken van (delen van) het DSO.

Deze vangnetten zorgen ervoor dat bevoegd gezagen de belangrijkste uitvoeringsprocessen kunnen blijven uitvoeren totdat ze de landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV) wel kunnen gebruiken zoals bedoeld.

Niet alle TAM lenen zich voor testen in het kader van IKT. Zo wordt een aantal TAM als dienstverlening aangeboden (bijvoorbeeld de TAM voor Behandeldiensten, Gerelateerde verzoeken, Instellen omgevingsoverleg).

In eerdere IKT fasen zijn reeds getest:

- TAM IMRO Omgevingsplan
- TAM IMRO Omgevingsverordening (IMRO-deel)
- TAM Voorbereidingsbesluit

In geen van deze testcases zijn blokkerende bevindingen gevonden.

In IKT 4 is de volgende TAM succesvol getest:

- TAM Voorbereidingsbesluit met meervoudige tijdelijke regelingdelen

Daarmee resteren nog de volgende te testen TAM:

- TAM IMRO Omgevingsverordening (deel 'placeholder op basis van STOP-TPOD')
- TAM Projectbesluit, TAM Reactieve interventie en TAM Instructie (ook voor provincies). Deze zijn zogenaamde IMRO-TAM.

Provincies verwachten deze te kunnen testen in IKT-5.

1.6 Vervolg IKT-aanpak IKT-5 en verder

1.6.1 Gemeenten

In IKT-5 zal de focus van de gemeenten met name liggen op de gemeentelijke planketen, de interbestuurlijke planketen en de gehele DSO-keten waarmee ook een aantal niet in IKT-4 behaalde doelen worden opgenomen in IKT-5. Specifiek voor deze ketens hebben de deelnemende gemeenten op hoofdlijnen de volgende doelen:

- testen van nieuwe functies in de plansoftware binnen de gehele plan- en DSO-keten (onder andere basismutaties)
- voortzetten van de testen van de inhoudsvarianties van het omgevingsplan
- testen van het validatie- en publicatieproces
- testen van de landelijke voorziening viewer Documenten op de kaart
- testen van de interactie tussen de verschillende gemeentelijke en provinciale instrumenten.

Naast de testen met de planketen en DSO-keten, worden enkele specifieke testen binnen de toepasbare-regels-keten (uitwisseling van STTR-bestanden en maatregelen op maat) en vergunningenketen (BOPA en interbestuurlijke samenwerking met waterschappen en provincies) uitgevoerd.

1.6.2 *Provincies*

Tijdens IKT-5 verwachten provincies in de planketen te kunnen testen met het muteren op basis van basismutaties in plaats van integrale tekstvervanging. Als de ontwikkeling van de decentrale plansoftware voorspoedig verloopt, kunnen provincies ook testen met omgevingsnormen en omgevingswaarden in hun verordeningen. Verder verwachten provincies de resterende tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) te testen voor het projectbesluit, de reactieve interventie en de instructie. Samen met medeoverheden wordt verder ingezet op het interbestuurlijk testen van zowel de planketen als de ketens voor toepasbare regels en vergunningverlening.

1.6.3 *Waterschappen*

Komende periode zal de nadruk gelegd worden op de uitvoering van testscenario's die inzicht moeten geven in de afdekking van risico's die zijn onderkend.

Daarnaast zal de nodige aandacht worden besteed aan het hertesten van functionaliteit van softwareleveranciers waarvoor inmiddels verbeteringen of aanvullingen zijn gedaan. Met name wordt aandacht besteed aan de functionaliteit die samenhangt met het projectbesluit.

Ook zal aandacht worden besteed aan de wijze waarop het besluitvormingsproces vorm kan krijgen, in combinatie met DSO-functionaliteit en lokale softwarefunctionaliteit. Hierbij moet gedacht worden aan de wijze waarop (in de loop van een ontwerp-, aanpassing- en vaststellingsproces) systemen ingezet kunnen worden.

Interbestuurlijke testen zullen opgepakt worden in samenspraak met andere bevoegd gezagen, waarbij regionale oefensessies benut zullen worden om testen voor te bereiden en uit te voeren.

1.6.4 *Rijk*

- Voor wat betreft de planketen richten de rijkspartijen zich in IKT-5 op: vervolg scenario's interbestuurlijk testen publicatie, beschikbaar stellen voorbereidingsbesluit met tijdelijke regelingdelen (meer complexe scenario's), en eventueel het extra testen van Programma, Bopa en projectbesluit.
- Bij de vergunningenketen zullen de rijkspartijen zich richten op: interbestuurlijk testen door alle daarvoor in aanmerking komende rijkspartijen met meervoudige complexe aanvragen met gebruikmaking van de Samenwerkfunctionaliteit. Waaronder de Noordzee-casus en de Geothermiecasus Limburg
- Voor zowel de Planketen als de Vergunningenketen wordt ook ingezet op het hertesten van nog openstaande bevindingen.

2 Testbevindingen IKT-4 in cijfers

Een deel van de opdracht voor het IKT-project betreft:

1. Rapporteer de bevindingen en borg dat deze in het reguliere proces worden belegd.
2. Adviseer over de prioriteit en het belang van de afhandeling van de gerapporteerde bevindingen.

Onderstaande figuren geven een beeld van de aard van de bevindingen, door wie ze zijn ingediend, de huidige status (uitdraai 25 april 2023) en de processtappen in de keten waarop de bevindingen betrekking hebben. Bevindingen worden teruggelegd en opgevolgd bij de DSO-ontwikkelteams en bij de softwareleveranciers (vaak via de betrokken bevoegd gezagen)


In totaal zijn in IKT-4 357 meldingen geregistreerd. Dit betreft 259 bevindingen en 98 wensen. 'Bevindingen' hebben betrekking op de werking van de gerealiseerde software, 'wensen' zijn de aanvullende gewenste functionaliteiten op software en een 'vraag' betreft een onduidelijkheid over werking van de functionaliteit.

Van groot belang zijn ook de prioriteiten die in het IKT-proces worden toegekend aan de bevindingen en wensen. Deze bepalen de 'ernst' en daarmee de gewenste prioriteit waarmee opvolging dient wordt gegeven door de oplostteams aan de bevindingen en wensen. Voor een toelichting op de classificatie van prioriteiten zie paragraaf 2.3.

Omwille van de leesbaarheid zijn de alle opgenomen figuren en de bijbehorende gegevens in dit hoofdstuk, met een grotere weergave opgenomen in Bijlage 5.

Figuur 2. Totaal aantal meldingen onderverdeeld naar bevinding of wens

Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.

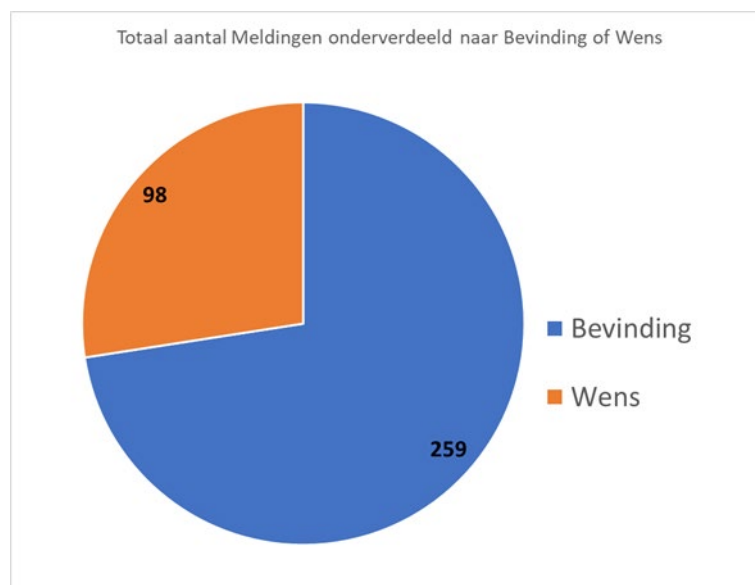

2.1 Herkomst van bevindingen en wensen


Onderstaand is gevisualiseerd de herkomst van de meldingen, onderverdeeld naar bevindingen, wensen en vragen. Aangegeven is wie de meldingen hebben ingediend, gegroepeerd naar bedrijfsleven, bevoegd gezag per koepel, softwareleverancier en koepelorganisatie.

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- Door het IKT-project is de 'MKB-toets' gefaciliteerd. Deze vond plaats in de eerste week van IKT-4. Over de MKB-toets is door het programma AdS separaat gerapporteerd
- Verder liggen de aantallen bevindingen en wensen redelijk in lijn met aantallen deelnemende bevoegde gezagen: gemeenten (14), provincies (5), waterschappen (8), rijkspartijen (4)

Figuur 3. Aantallen bevindingen en wensen per koepelorganisatie

Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.

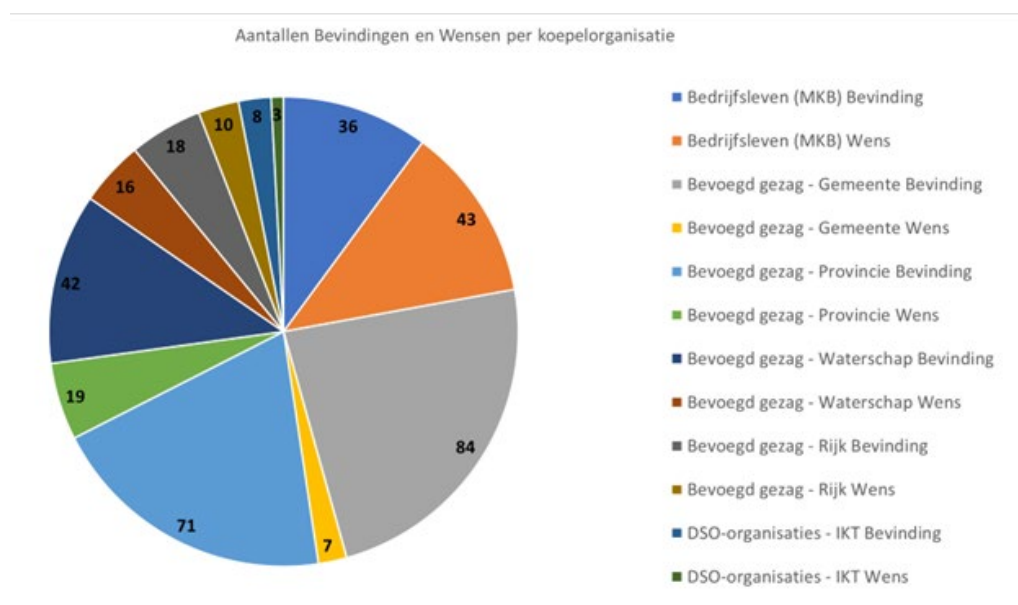

2.2 Statusafhandeling bevindingen en wensen


In bijgevoegde figuur is de status aangegeven van de afhandeling van de meldingen onderverdeeld naar bevindingen, wensen en vraag.

Een beknopte duiding van onderstaande figuur: Van de totaal 259 bevindingen zijn er 34 afgehandeld, 40 hebben de status hertesten. 40 meldingen hebben de status wacht op release Daarmee zijn (bijna) afgehandeld in totaal 114 meldingen.

Verder hebben 7 meldingen de status in TBO-funnel (in beoordelingsproces door Tactische Beheer Organisatie DSO-LV). Doorgezet naar behandelteam betreft 110 bevindingen. 28 bevindingen hebben de status wacht op melder, reactie ontvangen en vervallen. Daarmee zijn 145 meldingen nog in behandeling.

Figuur 4. Bevindingen en wensen per status

Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.

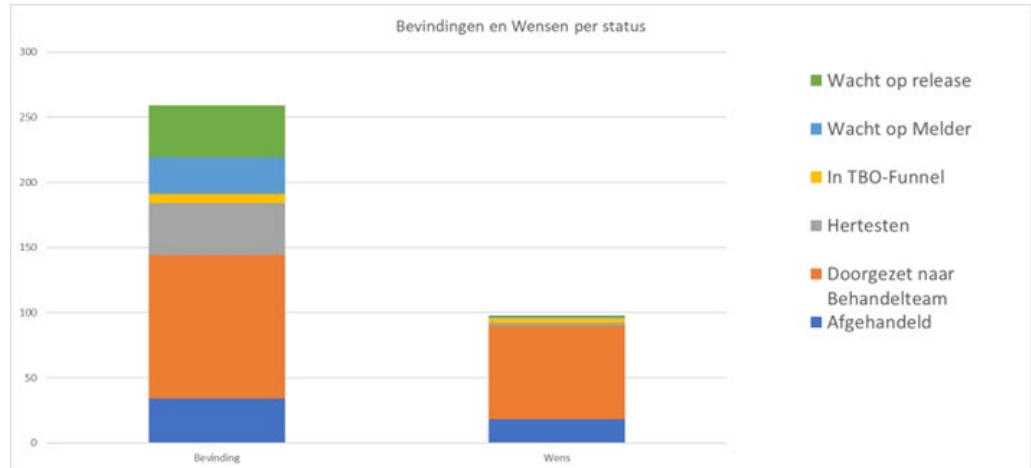

2.3 Meldingen per prioriteit

In onderstaande 3 figuren is aangegeven welke prioriteit is toegekend aan de meldingen. De gegeven prioritering heeft de volgende betekenis:

- **Prioriteit 1:** Een onderdeel van de gehele keten werkt niet, waardoor de dienstverlening naar alle gezagen (of een specifieke groep) niet werkt.
- **Prioriteit 2:** Alle onderdelen van de gehele keten werken, maar één, of een kleine groep gezagen ondervindt een belemmerende/blokkerende verstoring ten aanzien van de functionaliteit.
- **Prioriteit 3:** Er is een bevinding geconstateerd, maar de gebruiker kan functioneel wel verder (er is bijvoorbeeld een workaround beschikbaar, of een stap kan worden overgeslagen)
- **Prioriteit 4:** Er is geen belemmerende bevinding geconstateerd en de testuitvoering kan vervolgd worden.

Tijdens IKT-4 is 1 bevinding geclassificeerd met prioriteit 1. 'Zoeken van locaties' (in het Omgevingsloket) functioneerde 1,5 dag niet, vanwege een tijdelijke storing in een externe service (PDOK).

In onderstaande drie figuren worden de bevindingen en wensen weergegeven:


- Voor het DSO-LV
- Bevindingen lokale software-leveranciers
- Wensen lokale software-leveranciers

Een beknopte duiding van onderstaande drie figuren:

- De prioriteit 1-bevinding (niet beschikbaar zijn van een (locatie-)service in het Omgevingsloket) was binnen 1,5 dag opgelost
- De meeste bevindingen betreffen (niet urgente) prioriteit 3-bevindingen. Voor DSO-LV is het overgrote deel daarvan: 'afgehandeld', 'klaar voor release' of 'in proces van hertesten'
- Vanuit het IKT-project is er scherp zicht op de behandeling van DSO-LV-meldingen, omdat dit loopt via de centrale Tactische Beheer Organisatie. Minder scherp zicht is er op de behandeling van meldingen door de lokale bevoegde gezagen / lokale software-leveranciers. Dit loopt formeel via de lokale bevoegde gezagen. Hier wordt dan ook volstaan met alleen de vermelding van de prioriteiten van de meldingen voor lokale software-leveranciers.


Figuur 5. Bevindingen en wensen ten aanzien van DSO-LV

Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.

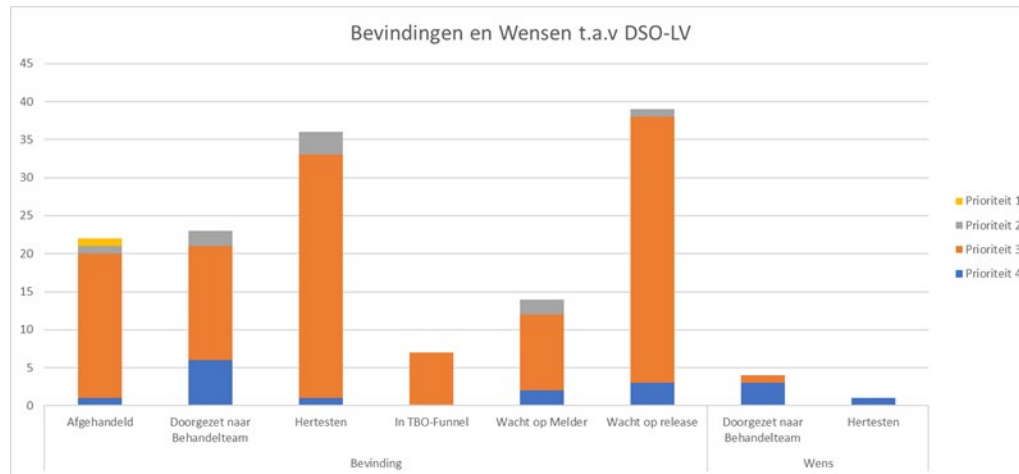


Figuur 6. Bevindingen voor lokale software-leveranciers per prioriteit

Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.

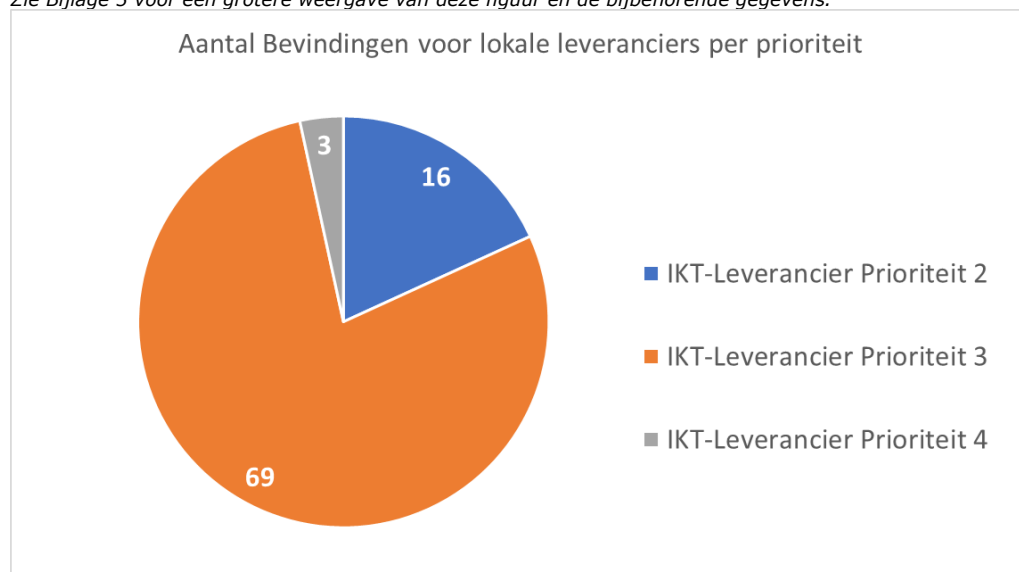

Figuur 7. Wensen voor lokale software-leveranciers per prioriteit

Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



2.4 Bevindingen per processtap


In onderstaande figuur zijn voor IKT-4 de bevindingen aangegeven per processtap, de zogenaamde 'capabiliteit' uit de minimale functionele set.

Een beknopte duiding van onderstaande 2 figuren:

- De meeste testbevindingen zijn gedaan bij de DSO-viewers (stap 04b) en bij het doorlopen en afhandelen van de vergunning-aanvraag (stappen 08b en 09b)
- Inzoomend op de prioriteiten, dan worden bij genoemde processtappen vooral bevindingen met een niet urgente prioriteit (3) geregistreerd. Dit is te verklaren doordat er relatief veel 'kleinere' bevindingen en wensen gedaan zijn op deze processtappen, mede ook doordat de bevindingen van de MKB-toets hierin meetellen.
- Geconstateerd kan ook worden dat in de planprocessen weliswaar minder bevindingen zijn geregistreerd, maar dat hieraan vaak wel een hogere prioriteit is toegekend, zoals de processtap 'valideren plan' (prioriteit 2). Dit is begrijpelijk, omdat dit mogelijke 'serieuze showstoppers' kunnen zijn in een planproces van een bevoegd gezag.


Figuur 8. Bevindingen per processtap

Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.

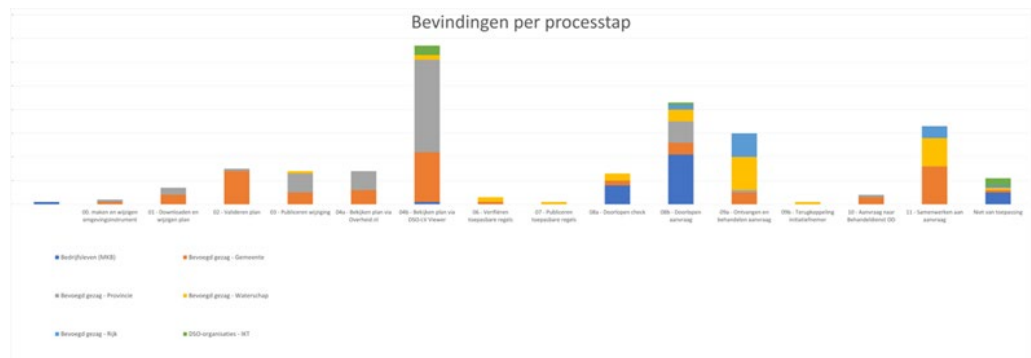

Figuur 9. Prioriteiten per processtap

Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.

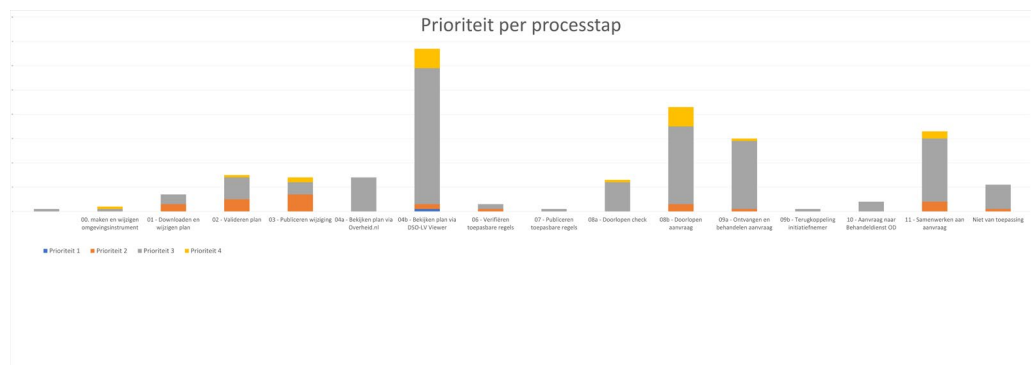

3 Trendanalyse geheel IKT (Fasen 1 tot en met 4)

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de meldingen binnen de gehele looptijd van IKT (totaal 24 testweken). Voor de gehele looptijd van IKT gaat het om in totaal 1432 meldingen:

- 1025 bevindingen
- 406 wensen
- 1 vraag

Omwille van de leesbaarheid zijn alle opgenomen figuren en de bijbehorende gegevens in dit hoofdstuk, met een grotere weergave opgenomen in Bijlage 6.

3.1 Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding


In onderstaand figuur staat per testweek het aantal meldingen opgesplitst naar bevinding, wens en vraag. Met uitzondering van testweek 5 en 6 is het aantal geconstateerde bevindingen vrij stabiel.

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- Er is sprake van een licht dalende lijn in het aantal bevindingen. Dat deze niet sterker daalt laat zich als volgt verklaren. Er wordt risico-gestuurd getest en elke IKT-fase wordt gefocussed op andere onderdelen en mogelijke risico's in het DSO als geheel. In fase 1 en 2 lag de focus bij de afzonderlijke (3) ketens. In fasen 3 en 4 is meer complexiteit 'opgezocht' door nadrukkelijk te kijken naar (interbestuurlijke) samenwerking. Ook wordt in elke IKT-Fase weer gekeken welke nieuw beschikbare functionaliteit (centraal en decentraal, maar ook de TAM) meegenomen kunnen worden in het IKT-testen. Door bewust deze complexiteit en risico's te blijven opzoeken wordt verklaard dat het aantal testbevindingen gedurende de IKT-uitvoering niet harder daalt.
- De 3 'pieken' laten zich als volgt verklaren. In testweken 5 en 6 is vooral de planketen indringender getest. In testweek 18 is de MKB-toets door het IKT-team gefaciliteerd. Dit leverde relatieve veel bevindingen en wensen op met een lagere prioriteit. Over de MKB-toets is inhoudelijk separaat gerapporteerd door het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Figuur 10. Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding

Zie Bijlage 6 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.

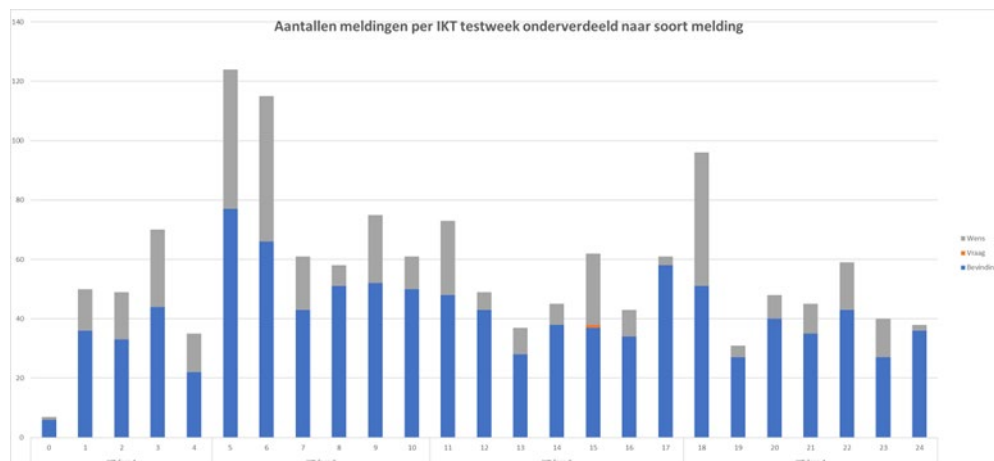

3.2 Aantal meldingen in relatie tot aantal deelnemers


Het aantal geplande en daadwerkelijk deelnemende bevoegd gezagen is in onderstaande tabel weergegeven.

Een beknopte duiding van onderstaand figuur:

- In het aantal deelnemende bevoegd gezagen aan de IKT-testweken is geen duidelijk dalende of stijgende trend te onderkennen. Deze bestaan per koepel uit bevoegde gezagen die al vele testweken hebben meegedaan en andere bevoegde gezagen die korter deelnemen.
- Geconstateerd wordt dat niet altijd het aantal geplande gezagen ook allemaal deelnemen aan de feitelijke uitvoering in een testweek. Dit heeft vaak te maken organisatorische of technische redenen aan de kant van het bevoegd gezag.

Figuur 11. Aantal meldingen in relatie tot aantal deelnemers

Zie Bijlage 6 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.

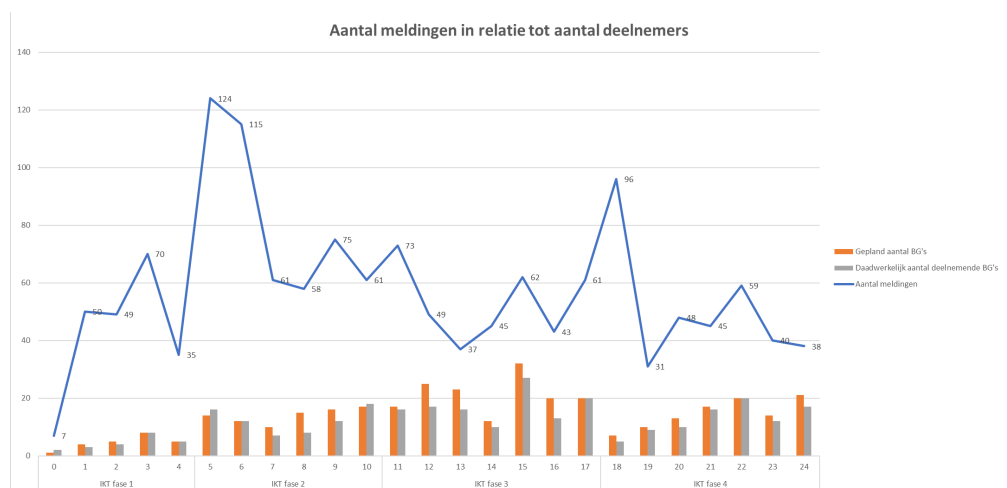

3.3 Verdeling bevindingen naar prioriteiten


In onderstaande tabel zijn de bevindingen gedurende IKT-fase 1, 2, 3 en 4 weergegeven naar prioriteit.

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- Er is een lichte daling van het totale aantal bevindingen
- Zeer incidenteel is sprake van een prioriteit 1 bevinding
- Er is een dalende trend in prioriteit 2 bevindingen
- Samenvattend zou kunnen worden gesteld voor de gehele IKT-uitvoering tot nu toe: er worden minder bevindingen geconstateerd (ondanks het feit dat de IKT-testcasuïstiek steeds verder in complexiteit toeneemt) en de bevindingen die aangetroffen worden zijn 'minder ernstig'

Figuur 12. Verdeling prioriteiten

Zie Bijlage 6 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.

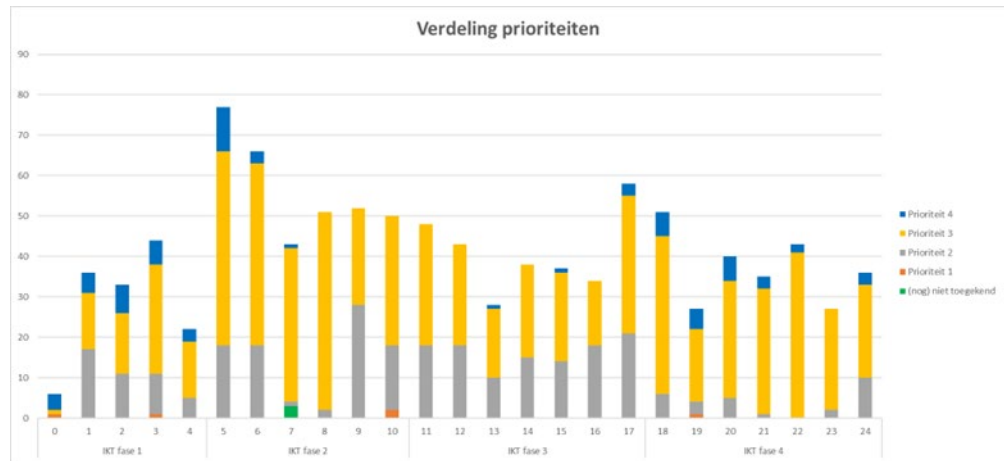

4 Verbetermaatregelen in IKT-4

4.1 IKT-registratie, -tooling, en rapportages

De adviezen van AcICT en Axini hebben voor een belangrijk deel betrekking op uitbouw van de bestaande IKT-tooling en –rapportages. Gedurende IKT-3 is hier al een start mee gemaakt en gedurende IKT-4 zijn concrete verbeteringen door het testteam beproefd in een zogenaamde 'proeftuin verbeteringen IKT'.

Concreet zijn de volgende acties uitgevoerd:

1. Analyse van het IKT-werkproces en waar mogelijk doorvoeren van verbeteringen
2. Registratietooling inzetten voor het gehele IKT-werkproces
3. Uitbouw van de IKT-rapportages
4. Proefdraaien met deze aanpassingen gedurende de laatste testweek van IKT-4

Analyse van het werkproces leverde niet zozeer inhoudelijke verbeteringen op, als wel de wijze van registreren en daarover rapporteren. Daar is in de IKT-proeftuin dan ook de nadruk op gelegd. Door het inzetten van de registratietooling over het gehele werkproces is een relatie te leggen tussen: plan van aanpak voor een IKT-fase, testplan per testweek, specifieke afspraken per koepel, uitwerking van de testuitvoering per deelnemend bevoegd gezag, koppeling aan de minimale functionele set (de testnorm) en koppeling aan de bevindingenregistratie.

Er is een aantal standaardrapportages benoemd die ook al (deels) gemaakt worden bij de huidige IKT-werkwijze. Hierbij gaat het om de volgende standaardrapportages:

- Testresultaten van een IKT-testweek
- Rapportage van een IKT-fase
- Plan van Aanpak voor een komende IKT-fase
- Dekking IKT

En daarnaast gaat het om een aantal rapportages die alleen relevant zijn binnen het IKT-project:

- Testplan voor een komende IKT-testweek
- Voortgang testuitvoering van een lopende testweek

Gedurende de laatste testweek (24) van IKT-4 is succesvol proefgedraaid met deze aangepaste tooling en rapportages. Vanaf de start van IKT-5 worden deze verbeteringen in productie genomen. Met ingang van rapportage IKT-5 zullen deze aanpassingen zichtbaar zijn in de rapportages.

4.2 Dekking IKT

Binnen het IKT-project wordt getest met koplopers van bevoegd gezagen en softwareleveranciers. Toch kan op basis van andere – binnen het programma Aan de slag met de Omgevingswet beschikbare overzichten – een uitspraak worden gedaan hoe alle andere bevoegd gezagen (anders dan de IKT-deelnemers) 'geraakt worden' door de uitgevoerde IKT-testen. Immers, een softwareleverancier bedient niet alleen het aan IKT deelnemende bevoegd gezag met haar oplossing, maar ook een groot aantal andere bevoegd gezagen met dezelfde oplossing.

In de uitgevoerde analyse is gekeken welke unieke combinaties van softwareleveranciers er zijn voor de drie ketens (plan, toepasbare regels en VTH) en welke functionaliteiten van de minimale functionele set in het kader van IKT geraakt zijn door deze unieke combinatie. Doordat bij het programma Aan de slag met de

Omgevingswet bekend is op welke bevoegde gezagen deze unieke combinatie ook van toepassing is, kan dus iets gezegd worden over de (indirecte) dekking van IKT voor álle bevoegde gezagen. Binnen IKT noemen we dit de IKT-dekking. Bij het 'raken' van de minimale functionele set wordt daarbij ook verbijzonderd naar juridische instrumenten en mutatievormen.

De eerste analyses die zijn uitgevoerd gedurende IKT-4 geven een goed inzicht in deze landelijke IKT-dekking. Gekeken is naar alle bevoegd gezagen die aangesloten zijn op de pre-productie-omgeving. Deze worden bediend door in totaal 99 unieke leverancierscombinaties (Plan-TR-VTH).


Zo bedienen de 'bovenste' 10 van deze leverancierscombinaties daarbij meer dan 50% van alle bevoegde gezagen. Vanuit het oogpunt van risico-gestuurd testen zijn de 'bovenste' leverancierscombinaties dus het meest relevant om in IKT mee te nemen.

Daarmee is focussen op de grote leverancierscombinaties één van de onderscheidende factoren voor gewenste IKT-deelname. Andere factoren zijn bijvoorbeeld: de releaseplanning van de leverancier (zie daarvoor ook de 'basischecks' op de website van programma Aan de slag met de Omgevingswet) en de implementatievoorbereidingen bij het bevoegd gezag zelf.

Parallel aan bovenstaande zal in IKT-5 ook onderzocht worden of bij de IKT-registratie (en daarmee ook in de rapportage) er een verdere 'objectivering van de gebruikte content' kan plaatsvinden. Immers, als een functionaliteit in de keten werkt met simpele content, betekent dit niet automatisch dat complexe content ook probleemloos werkt in de keten. IKT werkt in toenemende mate met complexe content. Om ook echt appels met appels te kunnen vergelijken is het verstandig de classificatie van de content in het test- en registratieproces van IKT verder te 'objectiveren'. Eerste resultaten hiervan worden verwacht na IKT-5.

BIJLAGE 1 De DSO keten in 11 stappen

Figuur 1. Procesplaat DSO-keten in 11 stappen

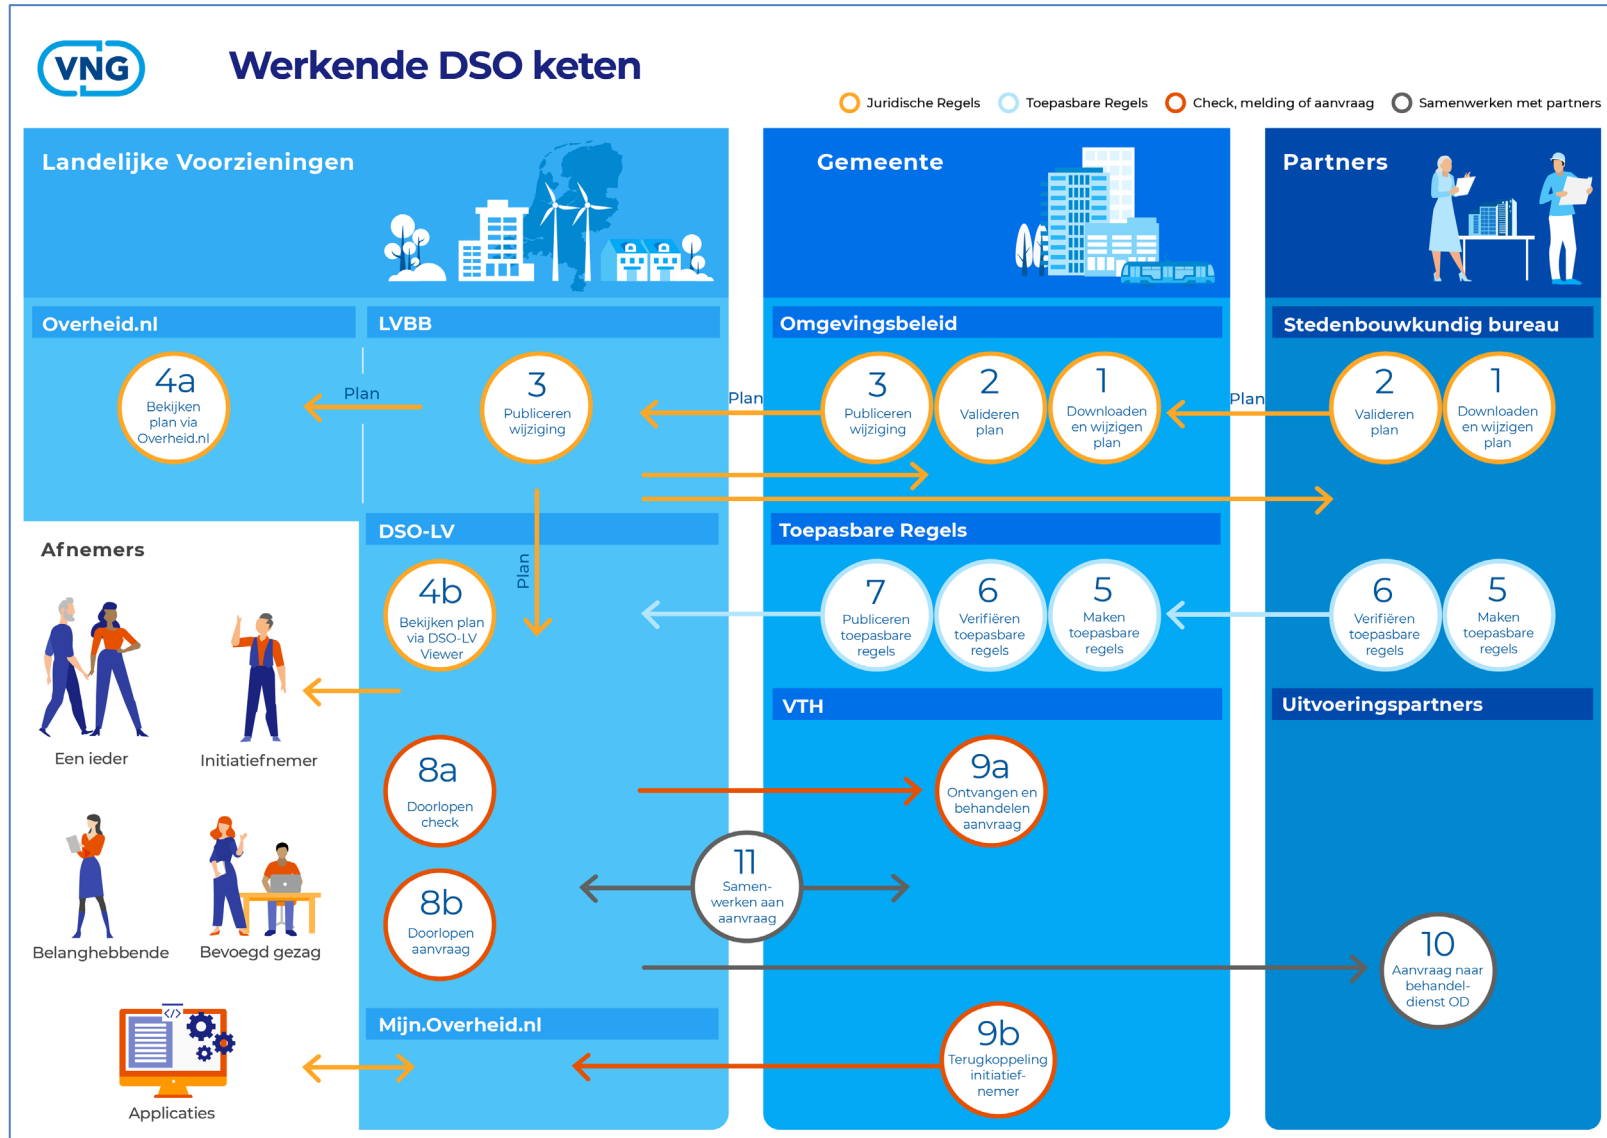

BIJLAGE 2 Minimale functionele set en IKT-4

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke functionaliteiten uit 'de minimale functionele set' onderdeel zijn van de uitgevoerde testen in IKT-4. Ook is aangegeven welke functionaliteiten onderdeel waren van de testen vóór IKT-4 (IKT 1-2-3) en welke functionaliteiten beoogd zijn te testen ná IKT-4.

SCOPE IKT			VNG	IPO	UvW	Rijk	VNG	IPO	UvW	Rijk	VNG	IPO	UvW	Rijk
Processtap	Niet binnen IKT	Wel binnen IKT	voor IKT-4				tijdens IKT-4				na IKT-4			
0	Inhoudelijke juridische test TAM	TAM in relatie tot de keten	X	X				X				X		
1	Uitgebreide test van de bruidsschat	1.1 kunnen starten met de definitieve versie van de bruidsschat in relatie tot de (plan)keten					X				X		X	
1	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel opstellen en wijzigen	1.2 kunnen opstellen en wijzigen omgevingsinstrument in relatie tot de (plan)keten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel stadia omgevingsinstrumenten	1.3 kunnen omgaan met levenscyclus/stadia van omgevingsinstrumenten in relatie tot de (plan)keten		X	X		X	X	X		X	X	X	
1	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel werkproces	1.4 kunnen ondersteunen bij het werkproces in relatie tot de (plan)keten			X			X	X		X	X	X	
1	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel raadplegen	1.5 kunnen raadplegen van omgevingsinstrumenten (nu geldend en concepten) in relatie tot de (plan)keten		X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
1	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel samenwerken	1.6 kunnen samenwerken met andere organisaties			X	X			X	X	X	X	X	X
2	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel validaties	2.1 kunnen valideren van omgevingsdocumenten in relatie tot de (plan)keten	X	X	X		X	X			X	X	X	X

SCOPE IKT			VNG IPO UvW Rijk				VNG IPO UvW Rijk				VNG IPO UvW Rijk			
Processtap	Niet binnen IKT	Wel binnen IKT	voor IKT-4				tijdens IKT-4				na IKT-4			
3	Applicatiebrede functionele test plansoftware – onderdeel publicatie	3.1 kunnen publiceren van omgevingsinstrument in relatie tot de (plan)keten: diverse omgevingsinstrumenten, verschillende varianten	X	X	X		X	X	X		X	X	X	X
4	Brede functionele test van LVBB-viewer, non functionals (onder andere performance), gebruiksvriendelijkheid, acceptatie-test	4a. bekijken omgevingsdocument (LVBB) in relatie tot de (plan)keten	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
4	Brede functionele test van DSO-LV-viewer, non functionals (onder andere performance), gebruiksvriendelijkheid, acceptatie-test.	4b. bekijken omgevingsdocument (DSO-LV-viewer) in relatie tot de (plan)keten	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Brede functionele test van Viewer Documenten op de kaart (VDK), non functionals (onder andere performance), gebruiksvriendelijkheid, acceptatie-test.	4c. bekijken omgevingsdocument in VDK in relatie tot de (plan)keten		X	X		X	X	X		X	X	X	X
5	Applicatiebrede functionele test van toepasbare-regelsoftware	5.1 kunnen opstellen en beheren van toepasbare regels in relatie tot de keten	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
5	Applicatiebrede functionele test van toepasbare-regelsoftware	5.2 kunnen genereren van toepasbare regels in STTR-formaat in relatie tot de keten	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
6	Applicatiebrede functionele test van toepasbare-regelsoftware	6.1 kunnen opstellen en beheren van toepasbare regels in relatie tot de keten	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
7	Applicatiebrede functionele test van toepasbare-regelsoftware	7. publiceren toepasbare regels	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
8	Brede functionele test van Omgevingsloket – check, non-functionals (onder andere performance), gebruiksvriendelijkheid, acceptatietest	8a. Vergunningcheck in relatie tot de VTH-software	X	X	X		X	X	X		X	X	X	
8	Brede functionele test van Omgevingsloket – aanvraag, non functionals (onder andere performance), gebruiksvriendelijkheid, acceptatietest	8b. aanvraag in relatie tot de VTH-software (meerdere paden)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8		BOPA in relatie tot de keten	X				X						?	X

SCOPE IKT			VNG IPO UvW Rijk				VNG IPO UvW Rijk				VNG IPO UvW Rijk			
Processtap	Niet binnen IKT	Wel binnen IKT	voor IKT-4				tijdens IKT-4				na IKT-4			
9	Applicatiebrede functionele test van VTH-software	9a. ontvangen en behandelen aanvraag/melding in relatie tot aanvraag	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
9		9b. terugkoppeling initiatiefnemer								X	X	X	X	X
10	Brede functionele test behandeldiensten, acceptatietest	10. aanvraag naar andere behandeldienst	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X
11	Brede functionele test Samenwerkfunctionaliteit, acceptatietest	11. samenwerken aan aanvraag met partners	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X

BIJLAGE 3 Maatregelen naar aanleiding van adviezen AcICT

In onderstaande tabel wordt de status en implementatie in IKT-4 weergegeven van de maatregelen naar aanleiding van de door AcICT gegeven adviezen.

Passage advies AcICT (22/12/2022)	Nr.	Maatregel	Actiehouder	Status en implementatie in IKT-4
1. Vorm het bestaande IKT-projectteam om tot een professioneel, centraal ketentestteam.	M1	<i>QA – inhuur van externe QA-deskundigheid</i>	QA-DSO	Externe testdeskundige Axini is ingehuurd vanaf medio oktober 2022. Axini adviseert het DSO-programma over Quality assurance (QA) en daarmee ook het IKT-project.
	M2	<i>Uitbreiding testteam (IKT)</i>	Project IKT	Per begin 2023 is het huidige centrale IKT-testteam uitgebreid met drie extra functionele testers en een business-scenariospecialist. Ook de testteams bij de koepels zijn verder versterkt.
	M3	<i>Versterken regierol (IKT) – inzet fulltimeprojectleider IKT</i>	Project IKT	Projectmanager IKT is fulltime inzetbaar tot minimaal inwerkingtreding. Aansturing van het centrale testteam wordt vormgegeven samen met de testmanager en de projectleider uitvoering IKT (testcoördinator)
1.1. Voer met dit team de testen uit op basis van een fout- en voortgangsanalyse vanuit een gedegen uitgewerkt testontwerp.	M4	<i>Rapport testpiramide – inzicht leveren in en voor de keten welke testen er op welk niveau hebben plaatsgevonden.</i>	QA-DSO	Rapport testpiramide is opgeleverd door Axini.
	M5	<i>Risico's IWT – op systematische en grondige wijze risico's verbonden aan IWT in beeld brengen.</i>	QA-DSO	Risico's IWT zijn systematisch in beeld gebracht. Via het risico-management-proces wordt de voortgang gemonitord. Waar risico's gemitigeerd kunnen worden door IKT-testcasuïstiek, wordt dit opgenomen in de werkvoorraad van IKT.
	M6	<i>Advies aanvullende maatregelen – Scope is de testaanpak van de hele keten voor opvolgende testperiodes.</i>	Project IKT	Implementatie van aanvullende maatregelen is een permanent proces. Een van de maatregelen is het in beeld brengen van de testdekking in relatie tot de IKT-testuitvoering. Hier is in IKT-4 vorm aan gegeven door een analyse van de (indirecte) dekking van alle bevoegde gezagen door het IKT-testen. De definitieve analyseresultaten zullen in IKT-5 worden gerapporteerd. Zie ook hoofdstuk 4 van dit rapport.
	M7	<i>Complexe praktijkcasuïstiek (IKT) – In IKT wordt in toenemende mate met realistische complexe casuïstiek gewerkt die meerdere business-scenario's en risico's afdekt.</i>	Project IKT	Het proces wat al zichtbaar was in IKT-3, is in IKT-4 krachtig doorgezet. Testcasuïstiek waarbij in een test betrokken worden: meerdere ketens, met meerdere bevoegd gezagen en meer realistische (complexe) content. Ook uitbreiding naar meer betrokken softwareleveranciers.
	M8	<i>Strategie ketentesten (IKT) – Een reeds gevormde expertgroep expliciteert de strategie in de testaanpak om te komen tot de juiste testgevallen en maakt inzichtelijk in hoeverre het IKT dit voldoende afdekt.</i>	Project IKT	Relevant is hier het thans in voorbereiding zijnde Master-testplan voor het gehele DSO. Van dit plan vormt het 'IKT-testen' een onderdeel.

Passage advies AcICT (22/12/2022)	Nr.	Maatregel	Actiehouder	Status en implementatie in IKT-4
1.1. Haak waar nodig met name de expertise van bevoegd gezagen, onderzoeksbureaus en decentrale softwareleveranciers aan.	M9	<i>Testcombinaties over de hele keten (IKT) – Verschillende combinaties gaan intensief en voor langere periode samenwerken om langere tijd aan het IKT bij te dragen met op elkaar afgestemde casuïstiek.</i>	Project IKT	Zie M7
1.2. Zorg dat de scope van het testontwerp de gehele keten van DSO-LV tot en met de decentrale software omvat, zowel functioneel als niet-functioneel.		<i>Zie ook M7, M8, M9 en M11</i>		
	M10	<i>Unhappy flows (IKT) – In IKT wordt expliciet getest met unhappy flows.</i>	Project IKT	In IKT-3 is al een aantal unhappy flows getest. Dit is doorgezet in IKT-4.
1.3. Werk de niet-functionele keteneisen en ketennormen uit in een ontwerp en voer op basis daarvan ketenbrede testen uit.	M11	<i>Niet-functionele aspecten – Uitvoeren van een analyse of niet-functionele aspecten voldoende zijn afgedekt door maatregelen lager in de testpiramide en voor welke niet-functionele aspecten aanvullende maatregelen nodig zijn op ketenniveau.</i>	QA-DSO	Zie M4
1.4. Regisseer met dit centrale team tevens het door de bevoegd gezagen uitgevoerde oefenen en (acceptatie)testen.	M12	<i>Verrijken IKT-data met gegevens 'uit het land'</i>	QA-DSO	Naast het testen door IKT met bevoegd gezagen wordt er in het land veel geoefend en getest. Vanaf IKT-4 is nadrukkelijker aansluiting gezocht bij het oefenen en testen in het land. Belangrijk is hierbij dat ook dan gewerkt zal worden volgens de IKT-werkprocessen en kwaliteitsstandaarden.
	M13	<i>Aanvullend testen bij bevoegd gezagen</i>	Project IKT	Zie M12
2. Zorg dat dit team kan beschikken over een separate en integrale testomgeving met daarop centraal configuratiemanagement, ook na inwerkingtreding. Die omgeving moet overeenkomen met de productieomgeving, inclusief representatieve testdata. Tevens biedt deze omgeving de basis voor het testen van de hiervoor genoemde kwaliteitsattributen waarbij ook de decentrale software betrokken wordt.	M14a	<i>Functionele testomgeving (IKT) – Inventariseren wat er nog ontbreekt aan de bestaande productie-testomgeving om te kunnen ketentesten.</i>	Project IKT	Voor het IKT-project is het werken met de pre-productieomgeving (oefenomgeving) als testomgeving werkbaar. Hierdoor kan gewerkt worden met realistische content en software die gelijk is aan de productieomgeving.
	M14b	<i>Leveranciersomgeving – Uitvoeren van een analyse bij leveranciers om vast te stellen of gebruik van de huidige testeilanden voldoende kan zijn voor deze (pre-IWT) periode.</i>	QA DSO	Een analyse is uitgevoerd ten aanzien van de werkbaarheid van de huidige testomgeving (is de pre-productieomgeving, inclusief de zogenaamde test-eilanden). Deze analyse geeft aan dat de huidige situatie voor leveranciers voor IKT-testen werkbaar is. Wel loopt er een onderzoek naar een separate leveranciers-testomgeving.
	M15a	<i>Reproduceerbaarheid – Testgevallen zijn gedocumenteerd en testdata worden in het testgeval vastgelegd om de functionele reproduceerbaarheid te vergroten.</i>	Project IKT	Testgevallen zijn gedocumenteerd en testdata worden in het testgeval beschreven om de functionele reproduceerbaarheid te vergroten.
	M15b	<i>Reproduceerbaarheid – Project IKT zal aanvullend adviseren welke testen op welke wijze herhaald kunnen worden.</i>	QA DSO	Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de (functionele) reproduceerbaarheid van IKT-testgevallen voldoende is geborgd is in de wijze van vastleggen en documenteren.

Passage advies AcICT (22/12/2022)	Nr.	Maatregel	Actiehouder	Status en implementatie in IKT-4
<p>3. Richt een integrale bevindingenregistratie in voor het eigen maatwerk van DSO-LV en voer op basis hiervan fout- en voortgangsanalyses uit. Deze analyses kunnen een indicatie geven van het aantal latente fouten en van de tijd die nog nodig is om het gewenste kwaliteitsniveau te behalen.</p>	M16	<p><i>Geconsolideerde rapportage IWT (in samenwerking met IKT) – Inzichten in de risico's op basis van de testbevindingen, worden geconsolideerd in een rapportage die inzicht geeft op de vraag of we verantwoord in werking kunnen gaan.</i></p>	QA-DSO	<p>Tijdens IKT-4 zijn verbeteringen doorgevoerd in het proces van IKT -registratie, -tooling, en -rapportages. Zie hiervoor hoofdstuk 4 van dit rapport.</p>
	M17	<p><i>Trendanalyses – Uitvoeren van analyse op bevindingen om vast te stellen wat de trend is in hoeveelheid en aard van de fouten.</i></p>	QA-DSO	<p>Zie ook M6 en M16</p>

BIJLAGE 4 Deelnemende organisaties IKT-4

In onderstaande tabellen worden de deelnemende organisatie weergegeven van IKT-4, waarbij per bevoegd gezag ook het type IKT-test is vermeld.

	Gemeenten	Type testen
1	Apeldoorn	Plan-keten
2	Beekdaelen	Plan-keten
3	Bodegraven-Reeuwijk	Plan-keten, DSO-keten
4	Deventer	Plan-keten, DSO-keten
5	Dijk en Waard, provincie Noord Holland	Interbestuurlijke plan-keten
6	Eindhoven	Plan-keten
7	Leidschendam-Voorburg	Plan-keten
8	Purmerend	Plan-keten
9	Putten, OD Noord Veluwe	VTH-keten, VTH- samenwerking
10	Rijssen-Holten	Plan-keten
11	Roosendaal	Plan-keten
12	Schiedam	Plan-keten
13	Utrecht, RUD	DSO-keten, VTH-keten, VTH-samenwerking
14	Veenendaal	Plan-keten, DSO-keten

	Provincies	Type testen
1	Drenthe	Planketen
2	Gelderland	Planketen
3	Noord-Holland	Planketen, VTH-keten
4	Overijssel	Planketen, VTH-keten, VTH-Samenwerking
5	Utrecht	Planketen

	Waterschappen	Type testen
1	Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden	Plan-keten, DSO-keten
2	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	Plan-keten, DSO-keten
3	Waterschap Limburg	Plan-keten, DSO-keten, VTH-keten
4	Waterschap Rijn & IJssel	Plan-keten, DSO-keten, VTH-keten
5	Waterschap Hunze en Aa's	Plan-keten, DSO-keten, VTH keten
6	Waterschap Amstel Gooi & Vecht	Plan-keten, DSO-keten
7	Waterschap Rivierenland	Plan-keten, DSO-keten, VTH-keten
8	Waterschap Vallei en Veluwe	VTH-keten


	Rijkspartijen	Type testen
1	Rijkswaterstaat	VTH-keten, VTH-samenwerking interbestuurlijk
2	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland	VTH-keten, VTH-samenwerking interbestuurlijk
3	ProRail	VTH-keten, VTH-samenwerking
4	Service Team Rijk	Plan-keten (niet in IKT-verband, wel vermeldenswaardig)

Overige organisaties

- Softwareleveranciers
- Omgevingsdiensten

BIJLAGE 5 Figuren en tabellen bij hoofdstuk 2


Figuur 2. Totaal aantal meldingen onderverdeeld naar bevinding of wens

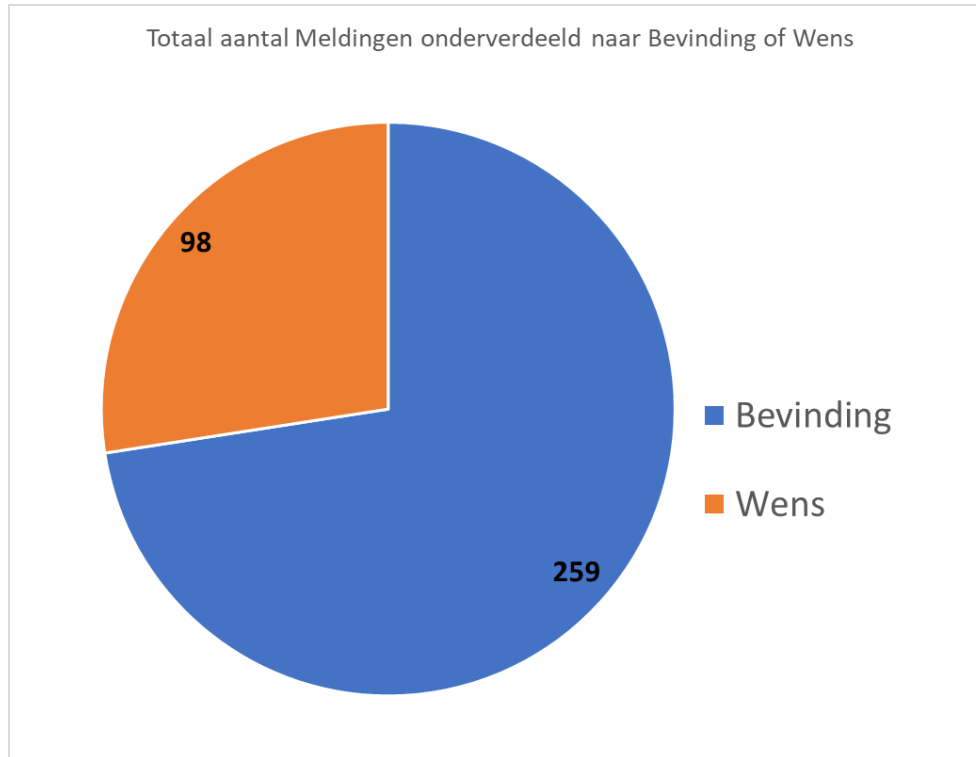

Totaal aantal meldingen onderverdeeld naar bevinding of wens

Soort melding	Aantal van issuetype
Bevinding	259
Wens	98
Eindtotaal	357


Figuur 3. Aantallen bevindingen en wensen per koepelorganisatie

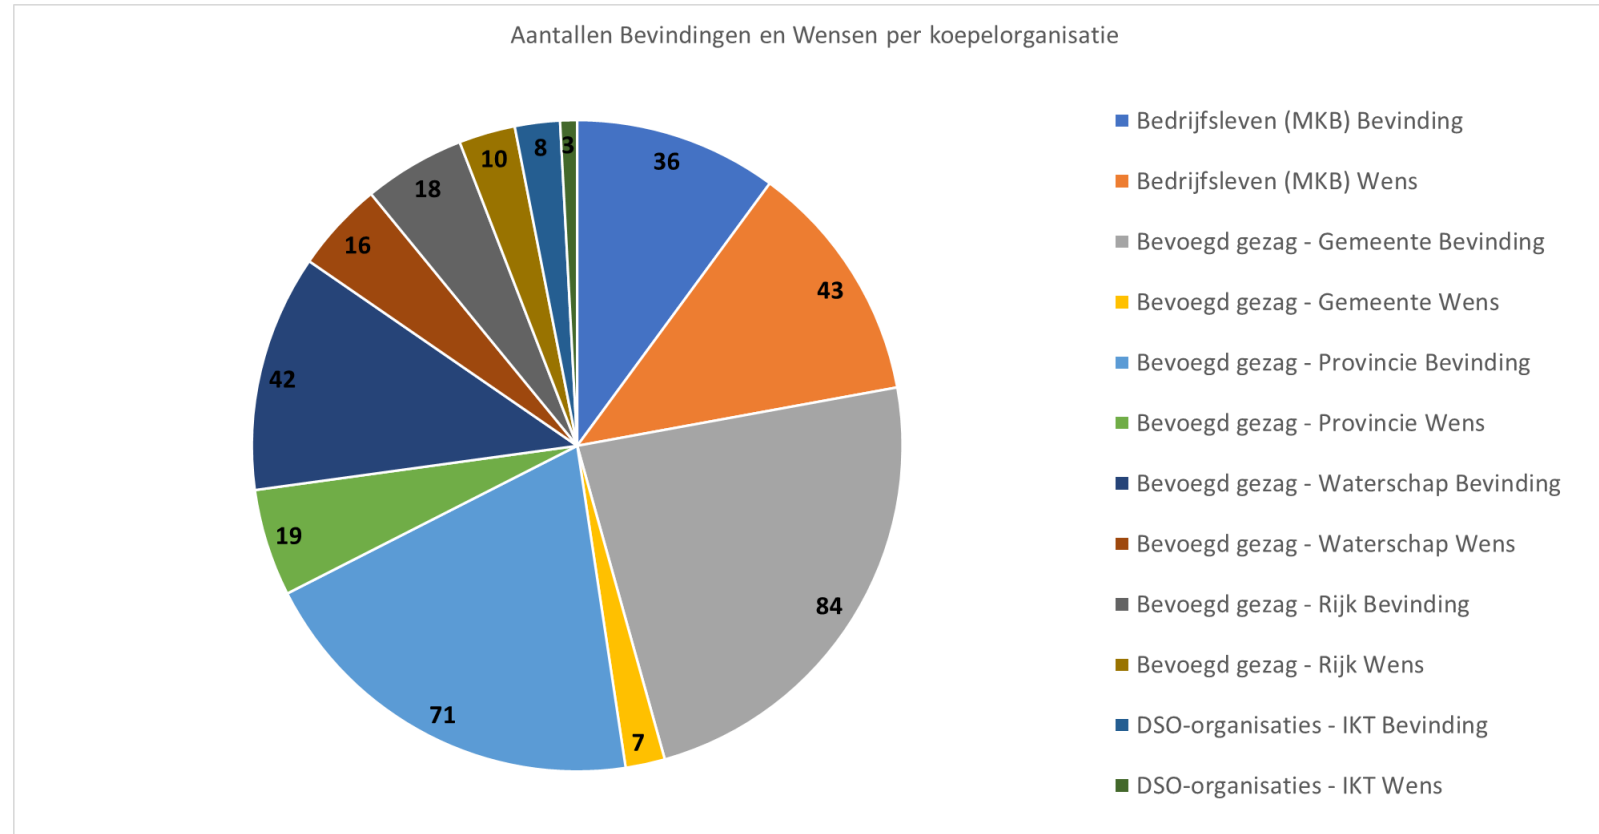

Aantallen bevindingen en wensen per koepelorganisatie

(Koepel)organisatie	Bevinding	Wens	Totaal
Bedrijfsleven (mkb)	36	43	79
Bevoegd gezag - Gemeente	84	7	91
Bevoegd gezag - Provincie	71	19	90
Bevoegd gezag - Waterschap	42	16	58
Bevoegd gezag - Rijk	18	10	28
DSO-organisaties - IKT	8	3	11
Eindtotaal	259	98	357

Figuur 4. Bevindingen en wensen per status

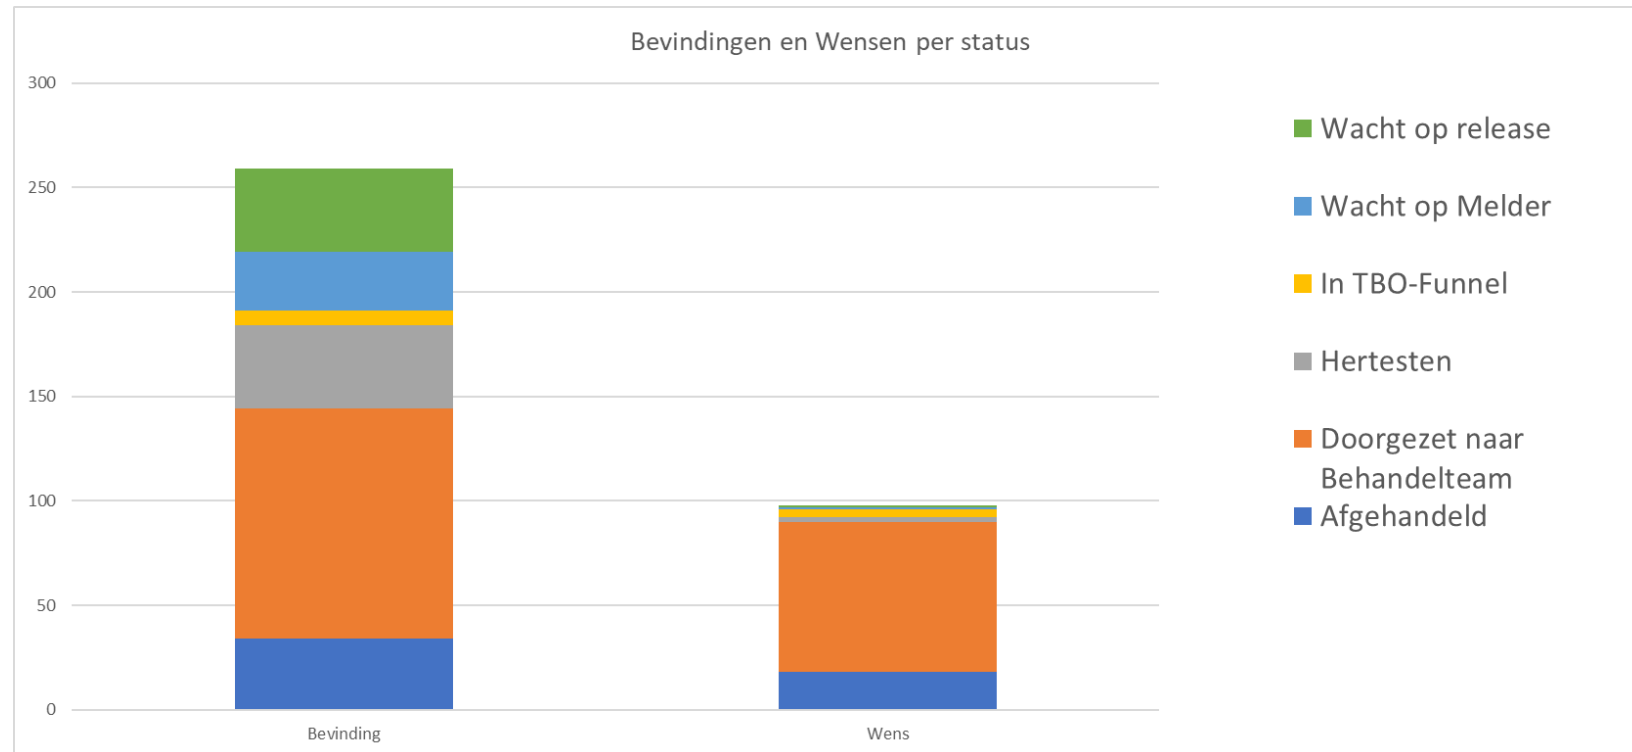


Status	Toelichting
Wacht op release	De oplossing die de bevinding c.q. wens verhelpt staat op de voorraadlijst van één van de oplostteams om gemaakt te worden of is al gemaakt. Moet nog wel formeel gereleased worden.
Te beoordelen testmanager	De bevinding c.q. wens dient nog beoordeeld te worden door de testmanager.
In TBO-Funnel	De oplossing die de bevinding c.q. wens verhelpt staat klaar om beoordeeld te worden of en hoe deze meegenomen zal worden in een release.
Vervallen (test-issue)	Betreft een testmelding voor alleen intern gebruik.
Wacht op Melder	De bevinding c.q. wens wacht in het proces omdat er aanvullende informatie van de melder nodig is voor een adequate beoordeling.
Vervallen	Tijdens de beoordeling van de melding is vastgesteld dat de melding geen volwaardige bevinding c.q. wens is, of mogelijk dubbel is opgevoerd en komt daarmee te vervallen
Reactie ontvangen	Er is een reactie ontvangen m.b.t. een bevinding c.q. wens voor een verdere beoordeling.
Hertesten	Er is een wijziging in het DSO (andere content, nieuw opgeleverde software of een antwoord met instructie e.d.) waarbij de melder gevraagd wordt om de bevinding c.q. wens opnieuw te testen. Afhankelijk van de uitkomst van deze hertest wordt de bevinding c.q. wens in het proces verder verwerkt.
Doorgezet naar Behandelteam	De bevinding c.q. wens is doorgezet naar een behandelteam van DSO-LV, een lokale softwareleverancier of de DSO-LV Business Analisten.

Afgehandeld	De bevinding doet zich niet meer voor door geactualiseerde software, gewijzigde content, infrastructurele aanpassingen of doordat de melder instructie heeft gekregen over het juiste gebruik van de functionaliteit. Ook is het is mogelijk dat de bevinding c.q. wens is afgewezen en er geen verandering wordt doorgevoerd.
-------------	--

Bevindingen en wensen per status

Soort melding	Afgehandeld	Doorgezet naar Behandelteam	Hertesten	In TBO-Funnel	Wacht op Melder	Wacht op release	Eindtotaal
Bevinding	34	110	40	7	28	40	259
Wens	18	72	2	4	1	1	98
Eindtotaal	52	182	42	11	29	41	357


Figuur 5. Bevindingen en wensen ten aanzien van DSO-LV

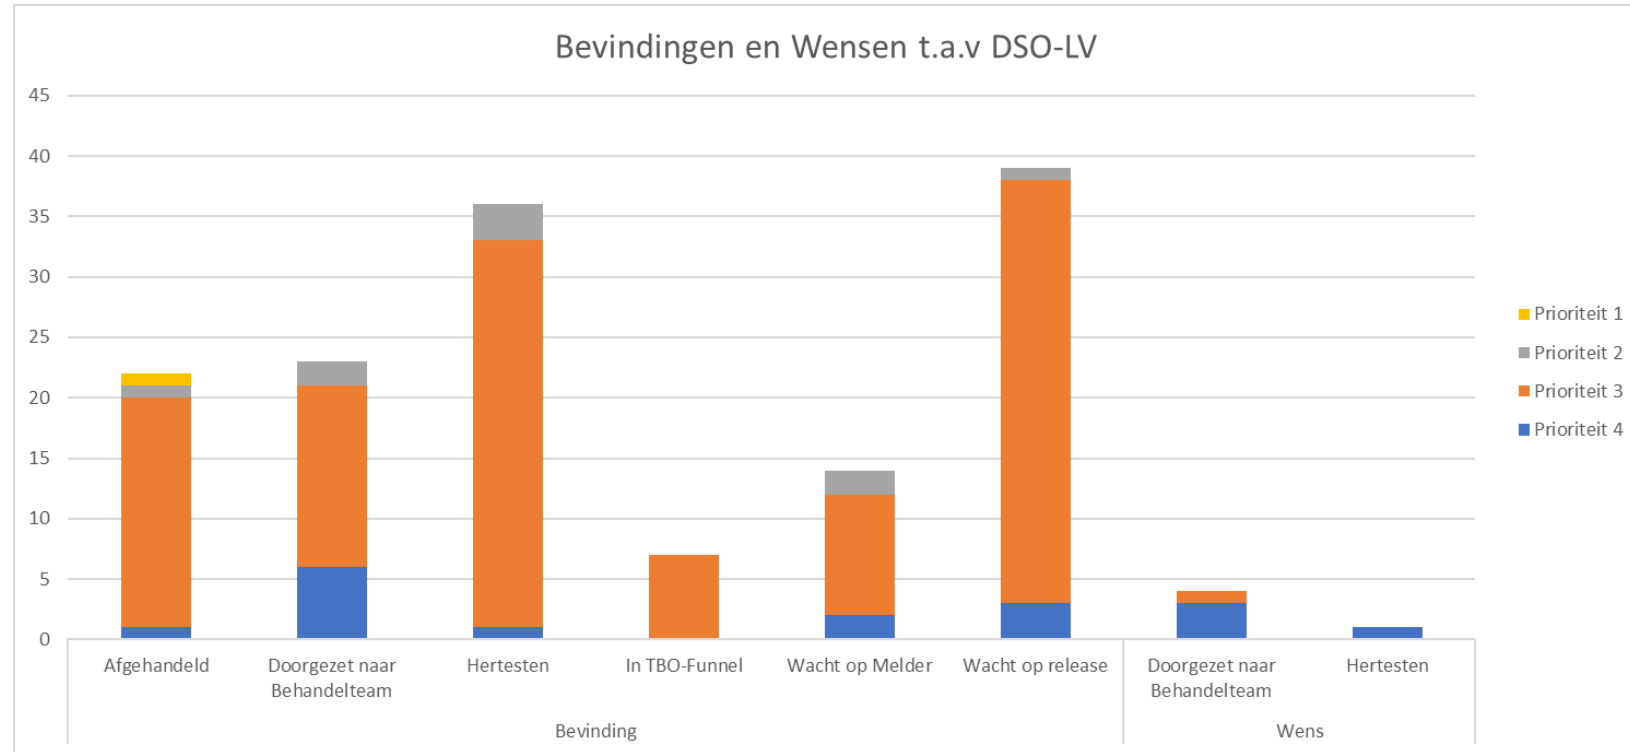

Bevindingen en wensen ten aanzien van DSO-LV


Soort melding	Prioriteit 4	Prioriteit 3	Prioriteit 2	Prioriteit 1	Eindtotaal
Bevinding	13	118	9	1	141
Afgehandeld	1	19	1	1	22
Doorgezet naar Behandelteam	6	15	2		23
Hertesten	1	32	3		36
In TBO-Funnel		7			7
Wacht op Melder	2	10	2		14
Wacht op release	3	35	1		39
Wens	4	1			5
Doorgezet naar Behandelteam	3	1			4
Hertesten	1				1
Eindtotaal	17	119	9	1	146

Figuur 6. Bevindingen voor lokale software-leveranciers per prioriteit

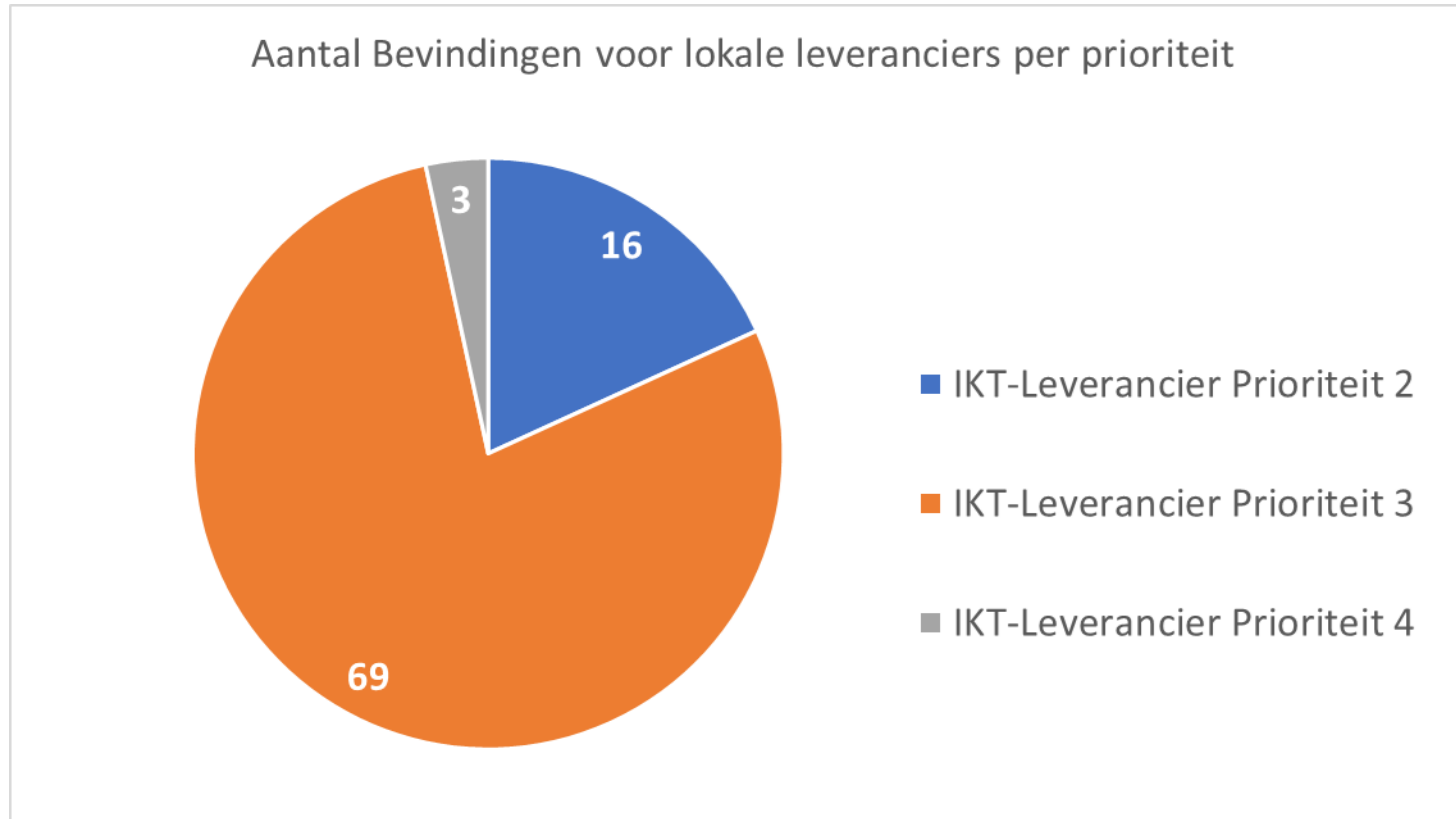


Bevindingen IKT-leveranciers per prioriteit	Aantal
Prioriteit 2	16
Prioriteit 3	69
Prioriteit 4	3
Eindtotaal	88

Figuur 7. Wensen voor lokale software-leveranciers per prioriteit

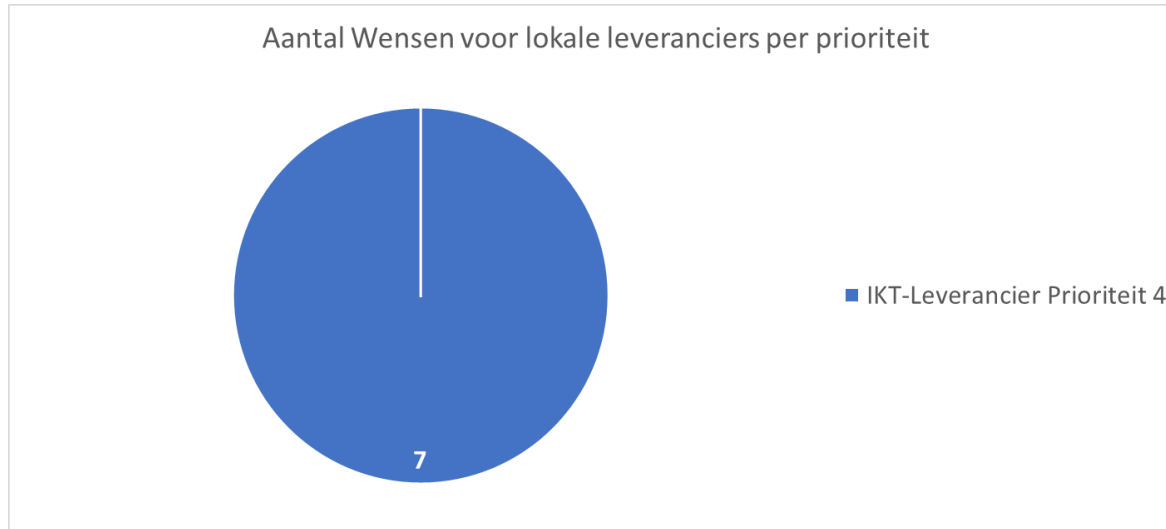

Wensen IKT-leveranciers per prioriteit	Aantal
Prioriteit 4	7
Eindtotaal	7


Figuur 8. Bevindingen per processtap

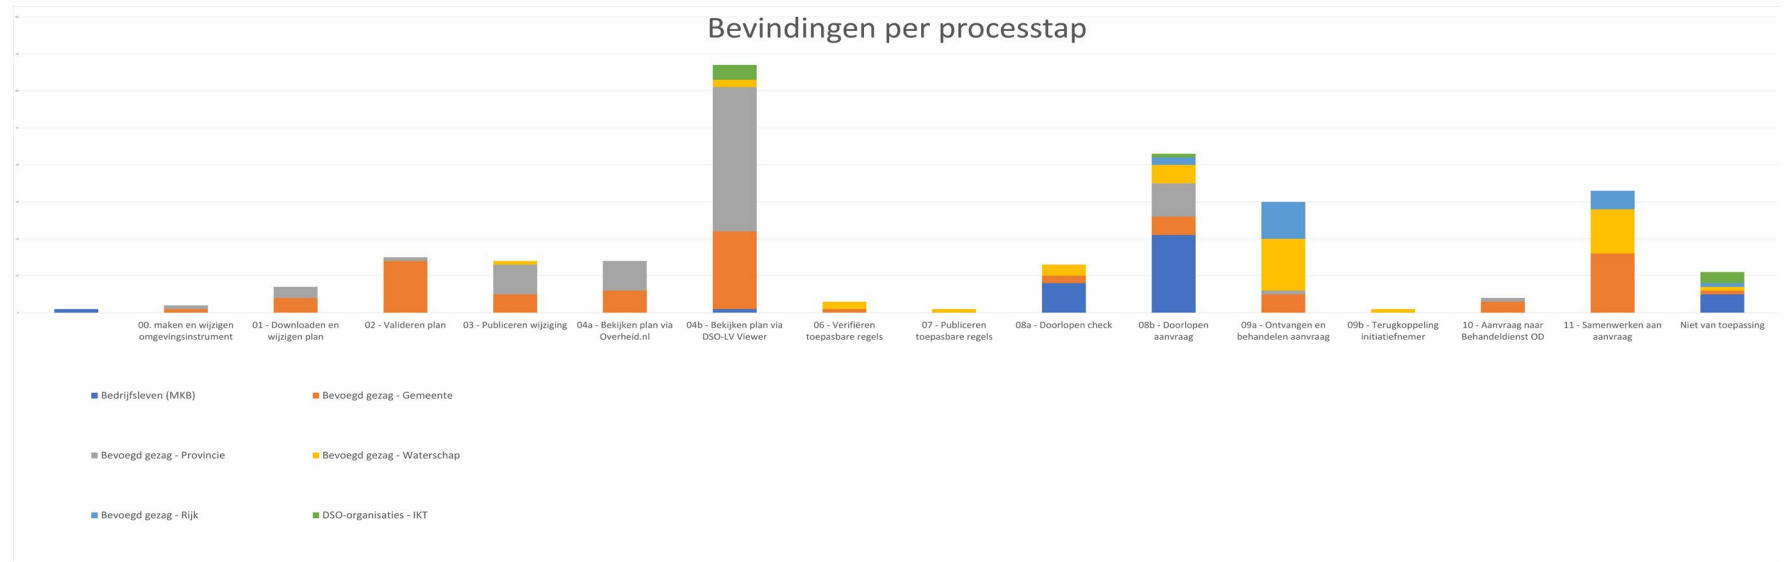

Bevindingen per processtap

DSO-processtap	Bedrijfsleven (mkb)	Gemeente	Provincie	Waterschap	Rijk	DSO-organisaties - IKT	Eindtotaal
Niet toegekend aan processtap	1						1
00. Maken en wijzigen omgevingsinstrument		1	1				2
01 - Downloaden en wijzigen plan		4	3				7
02 - Valideren plan		14	1				15
03 - Publiceren wijziging		5	8	1			14
04a - Bekijken plan via Overheid.nl		6	8				14
04b - Bekijken plan via DSO-LV viewer	1	21	39	2		4	67
06 - Verifiëren toepasbare regels		1		2			3
07 - Publiceren toepasbare regels				1			1
08a - Doorlopen check	8	2		3			13
08b - Doorlopen aanvraag	21	5	9	5	2	1	43
09a - Ontvangen en behandelen aanvraag		5	1	14	10		30
09b - Terugkoppeling initiatiefnemer				1			1
10 - Aanvraag naar Behandeldienst OD		3	1				4
11 - Samenwerken aan aanvraag		16		12	5		33
Niet van toepassing op processtap	5	1		1	1	3	11
Eindtotaal	36	84	71	42	18	8	259


Figuur 9. Prioriteit per processtap

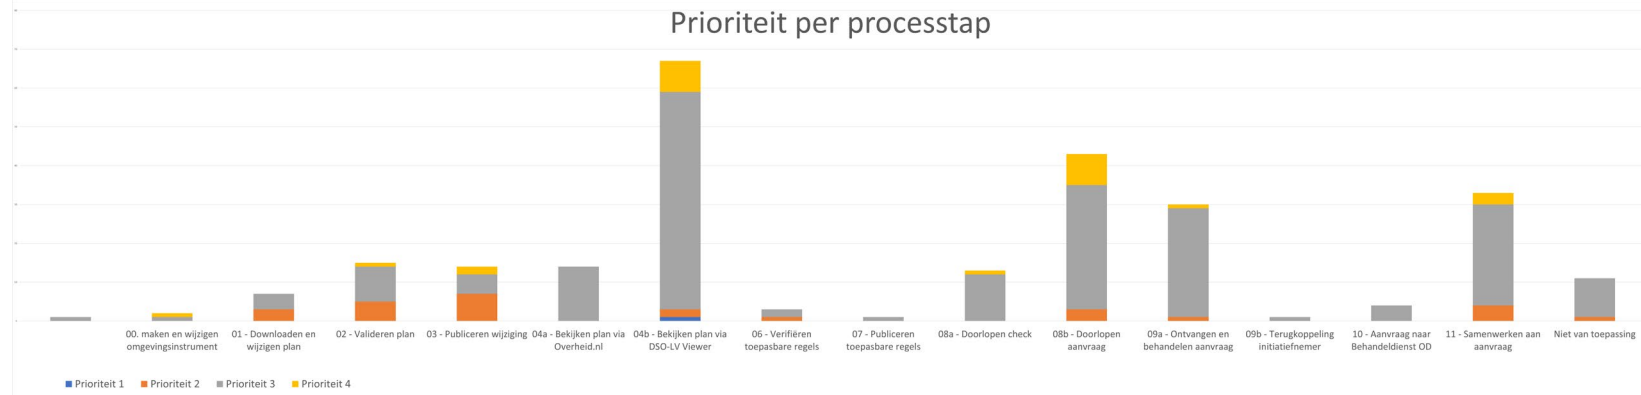

DSO Processtap	Prioriteit 1	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4	Eindtotaal
Niet toegekend aan processtap			1		1
00. maken en wijzigen omgevingsinstrument			1	1	2
01 - Downloaden en wijzigen plan		3	4		7
02 - Valideren plan		5	9	1	15
03 - Publiceren wijziging		7	5	2	14
04a - Bekijken plan via Overheid.nl			14		14
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	1	2	56	8	67
06 - Verifiëren toepasbare regels		1	2		3
07 - Publiceren toepasbare regels			1		1
08a - Doorlopen check			12	1	13
08b - Doorlopen aanvraag		3	32	8	43
09a - Ontvangen en behandelen aanvraag		1	28	1	30
09b - Terugkoppeling initiatiefnemer			1		1
10 - Aanvraag naar Behandeldienst OD			4		4
11 - Samenwerken aan aanvraag		4	26	3	33
Niet van toepassing op processtap		1	10		11
Eindtotaal	1	27	206	25	259

BIJLAGE 6 Figuren en tabellen bij hoofdstuk 3


Figuur 10. Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding

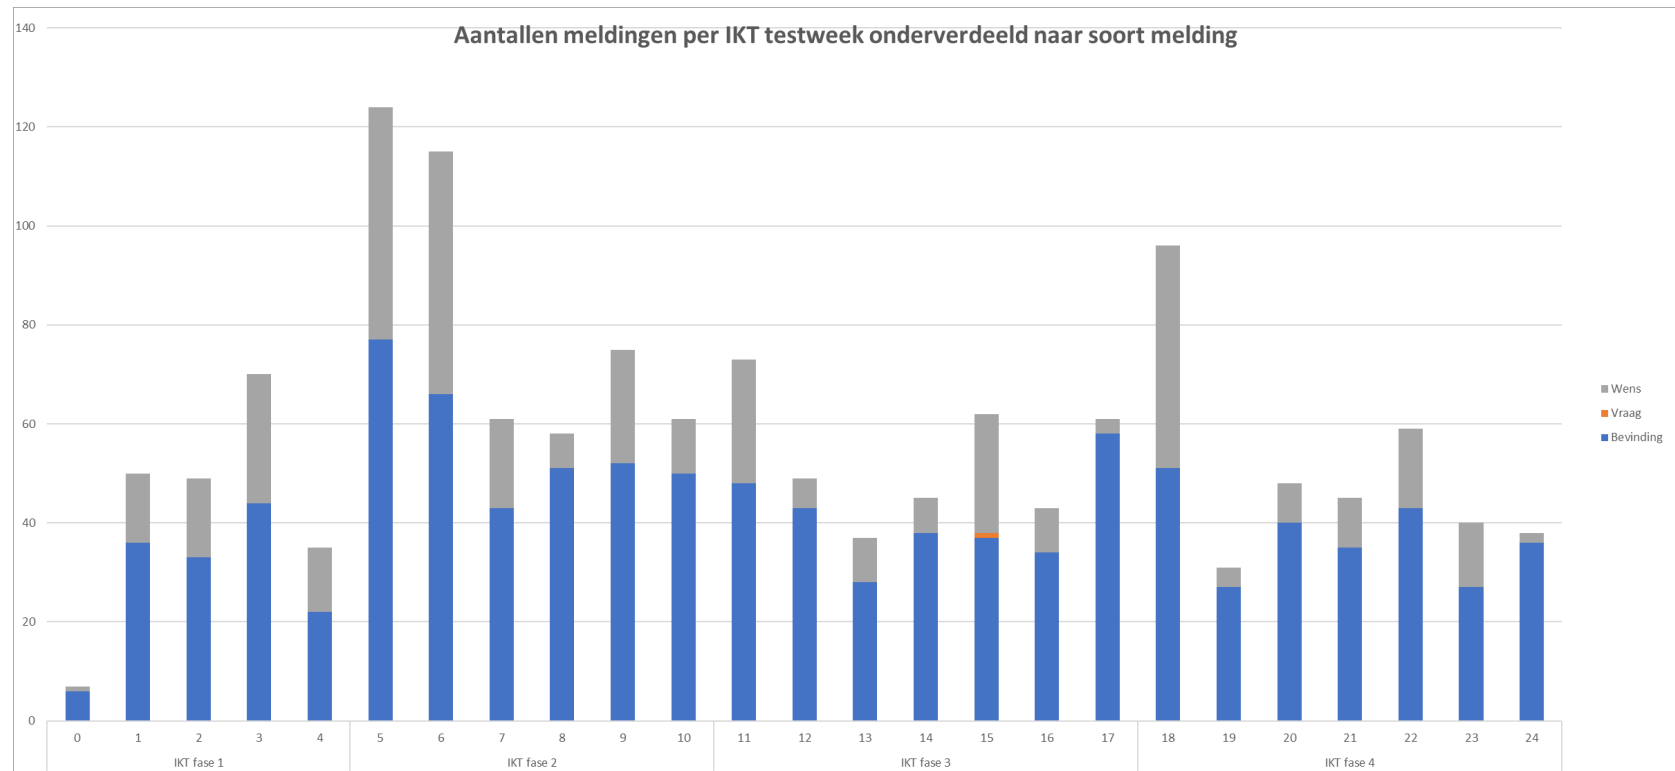

Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding

IKT-testfase en week	Bevinding	Vraag	Wens	Eindtotaal
IKT-fase 1	141		70	211
0	6		1	7
1	36		14	50
2	33		16	49
3	44		26	70
4	22		13	35
IKT-fase 2	339		155	494
5	77		47	124
6	66		49	115
7	43		18	61
8	51		7	58
9	52		23	75
10	50		11	61
IKT-fase 3	286	1	83	370
11	48		25	73
12	43		6	49
13	28		9	37
14	38		7	45
15	37	1	24	62
16	34		9	43
17	58		3	61
IKT-fase 4	259		98	357
18	51		45	96
19	27		4	31
20	40		8	48
21	35		10	45
22	43		16	59
23	27		13	40
24	36		2	38
Eindtotaal	1025	1	406	1432


Figuur 11. Aantal meldingen in relatie tot aantal deelnemers

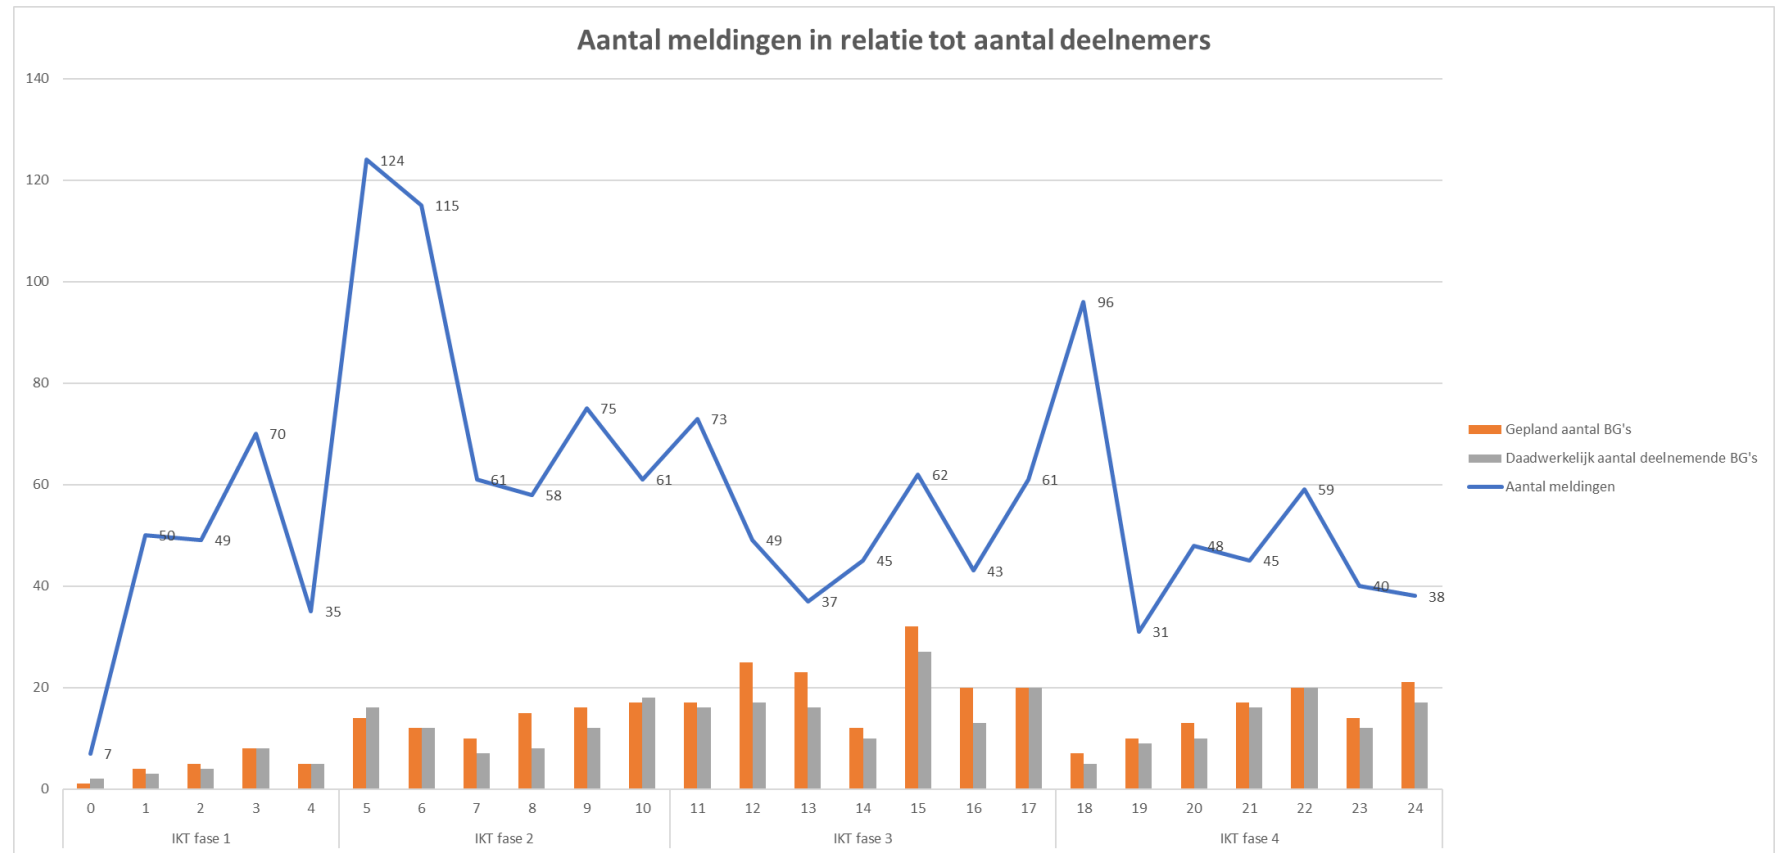

Aantal meldingen in relatie tot aantal deelnemers

IKT-testfase en week	Aantal meldingen	Gepland aantal bevoegd gezagen	Daadwerkelijk aantal deelnemende bevoegd gezagen
IKT-fase 1	211		
0	7	1	2
1	50	4	3
2	49	5	4
3	70	8	8
4	35	5	5
IKT-fase 2	494		
5	124	14	16
6	115	12	12
7	61	10	7
8	58	15	8
9	75	16	12
10	61	17	18
IKT-fase 3	370		
11	73	17	16
12	49	25	17
13	37	23	16
14	45	12	10
15	62	32	27
16	43	20	13
17	61	20	20
IKT-fase 4	357		
18	96	7	5
19	31	10	9
20	48	13	10
21	45	17	16
22	59	20	20
23	40	14	12
24	38	21	17
Eindtotaal	1432		

Figuur 12. Verdeling prioriteiten

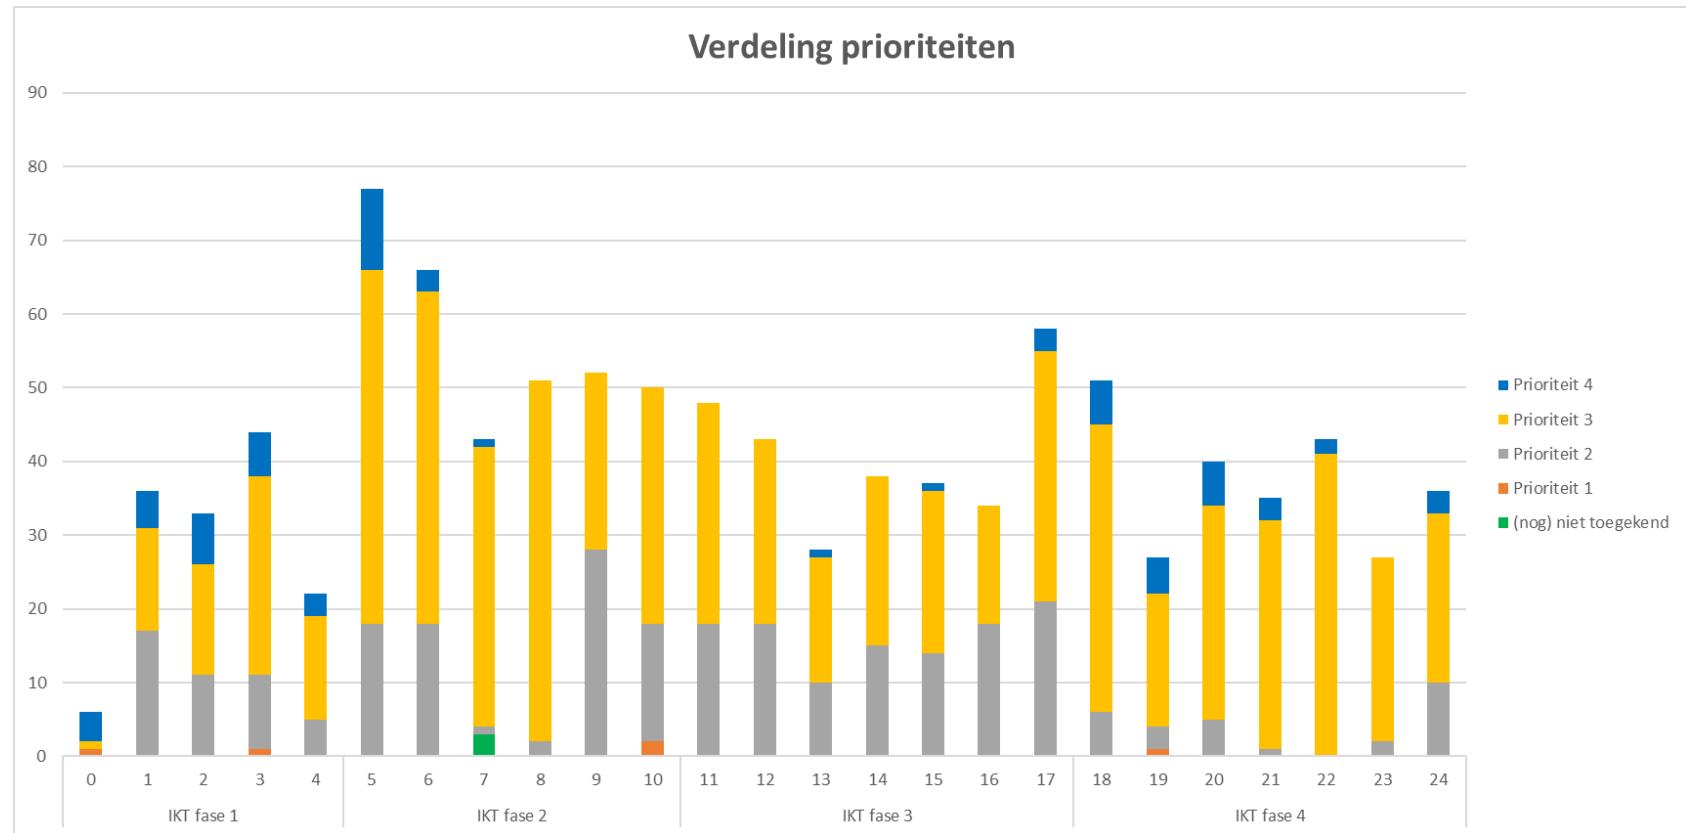

Verdeling prioriteiten

IKT-testfase en week	(nog) niet toegekend	Prioriteit 1	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4	Eindtotaal
IKT-fase 1		2	43	71	25	141
0		1		1	4	6
1			17	14	5	36
2			11	15	7	33
3		1	10	27	6	44
4			5	14	3	22
IKT-fase 2	3	2	83	236	15	339
5			18	48	11	77
6			18	45	3	66
7	3		1	38	1	43
8			2	49		51
9			28	24		52
10		2	16	32		50
IKT-fase 3			114	167	5	286
11			18	30		48
12			18	25		43
13			10	17	1	28
14			15	23		38
15			14	22	1	37
16			18	16		34
17			21	34	3	58
IKT-fase 4		1	27	206	25	259
18			6	39	6	51
19		1	3	18	5	27
20			5	29	6	40
21			1	31	3	35
22				41	2	43
23			2	25		27
24			10	23	3	36
Eindtotaal	3	5	267	680	70	1025
